



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1
1	ÉKMO2 Projekt várható ütemezése	1096 nap	Sze 17.12.06.	Szo 20.12.05.																
2	ÉKMO2 projekt lebonyolítás ütemezése		K 17.12.12.	Szo 20.12.05.																
3	Munkaterület átadás tervezési munkákra	1 nap	K 17.12.12.	K 17.12.12.																
4	Tervezési munkák	328 nap	Sze 17.12.13.	K 19.03.26.																
5	Hálózat	325 nap	Sze 17.12.13.	Cs 19.03.21.																
6	Jánd	67 nap	K 18.01.23.	Sze 18.05.02.																
7	Aranyosapáti	79 nap	Sze 18.01.17.	H 18.05.14.																
8	Mándok	280 nap	H 18.02.12.	Cs 19.03.21.																
9	Gávavencsellő	165 nap	Sze 17.12.13.	Sze 18.08.08.																
10	Tiszatelek	220 nap	Sze 17.12.13.	P 18.10.26.																
11	Beszterec	187 nap	Sze 17.12.13.	H 18.09.10.																
12	Újdombrád	181 nap	Sze 17.12.13.	P 18.08.31.																
13	Telep	299 nap	K 18.01.23.	K 19.03.26.																
14	Cigánd	185 nap	K 18.07.10.	K 19.03.26.																
15	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	188 nap	Cs 18.03.08.	Cs 18.12.06.																
16	Aranyosapáti	225 nap	P 18.01.26.	Sze 18.12.19.																
17	Mándok	101 nap	K 18.05.29.	H 18.10.29.																
18	Gávavencsellő	185 nap	Sze 18.01.31.	H 18.10.29.																
19	Tiszatelek	270 nap	K 18.01.23.	Cs 19.02.14.																
20	Kiviteli tervek jóváhagyása	245 nap	Sze 18.05.09.	Cs 19.04.18.																
21	Hálózat	245 nap	Sze 18.05.09.	Cs 19.04.18.																
22	Jánd	3 nap	Sze 18.05.09.	P 18.05.11.																
23	Aranyosapáti	4 nap	K 18.05.15.	P 18.05.18.																
24	Mándok	10 nap	P 19.04.05.	Cs 19.04.18.																
25	Gávavencsellő	1 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.																
26	Tiszatelek	10 nap	H 18.10.29.	Szo 18.11.10.																
27	Beszterec	10 nap	K 18.09.11.	P 18.09.21.																
28	Újdombrád	10 nap	H 18.09.03.	P 18.09.14.																
29	Telep	125 nap	K 18.10.16.	K 19.04.09.																
30	Cigánd	10 nap	Sze 19.03.27.	K 19.04.09.																
31	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	10 nap	P 18.12.14.	Sze 18.12.26.																
32	Aranyosapáti	10 nap	Cs 18.12.20.	Sze 19.01.02.																
33	Mándok	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.																
34	Gávavencsellő	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.																
35	Tiszatelek	10 nap	P 19.02.15.	Cs 19.02.28.																
36	Munkaterület átadása	274 nap	Sze 18.03.14.	Sze 19.04.10.																
37	Hálózat	212 nap	Sze 18.03.14.	H 19.01.14.																
38	Jánd	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.																
39	Aranyosapáti	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.																
40	Mándok	1 nap	H 19.01.14.	H 19.01.14.																




Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdet	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1
41	Gávavencsellő	1 nap	Cs 18.06.07.	Cs 18.06.07.																
42	Tiszatelek	1 nap	K 18.10.16.	K 18.10.16.																
43	Beszterec	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.																
44	Újdombrád	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.																
45	Telep	169 nap	Cs 18.08.16.	Sze 19.04.10.																
46	Cigánd	1 nap	Sze 19.04.10.	Sze 19.04.10.																
47	Vásárosnamény-Gergelyugornya	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.																
48	Aranyosapáti	1 nap	Cs 19.01.03.	Cs 19.01.03.																
49	Mándok	1 nap	P 18.10.26.	P 18.10.26.																
50	Gávavencsellő	1 nap	Cs 18.08.16.	Cs 18.08.16.																
51	Tiszatelek	1 nap	H 18.11.19.	H 18.11.19.																
52	Kivitelezési munkák kezdése	625 nap	H 18.06.04.	H 20.10.26.																
53	Jánd - Vásárosnamény	621 nap	H 18.06.04.	K 20.10.20.																
54	Hálózat helyreállítással	273 nap	H 18.06.04.	Cs 19.06.20.																
55	Gravitációs vezeték	194 nap	H 18.06.04.	P 19.03.01.																
56	1-0-0 - Petőfi, Árpád u.	47 nap	H 18.06.04.	K 18.08.07.																
57	1-1-0 - Árpád, Rákóczi u.	30 nap	P 18.08.10.	Cs 18.09.20.																
58	1-1-1 - Rákóczi u.	3 nap	K 18.09.11.	Cs 18.09.13.																
59	1-2-0 - Ady Endre u.	3 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.																
60	2-0-0 - Kossuth, Szabadság, Arany u.	56 nap	K 18.07.10.	K 18.09.25.																
61	2-1-0 - Jókai u.	7 nap	H 18.11.12.	K 18.11.20.																
62	2-2-0 - Jókai, Béke u.	19 nap	K 18.11.13.	P 18.12.07.																
63	2-2-1 - Dózsa, Béke	59 nap	H 18.12.10.	Cs 19.02.28.																
64	2-2-1-1 - Béke u.	7 nap	P 18.11.30.	H 18.12.10.																
65	2-2-2 - Jókai u	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.																
66	2-3-0 - 289 hrsz u.	24 nap	Sze 18.10.03.	P 18.11.09.																
67	2-4-0 - Kossuth u.	17 nap	H 18.07.09.	K 18.07.31.																
68	2-5-0 - Arany J u.	4 nap	K 18.09.04.	P 18.09.07.																
69	2-6-0 - Arany, Jókai u.	7 nap	P 18.08.24.	H 18.09.03.																
70	3-0-0 - Rákóczi, Tisza, Hunyadi u.	105 nap	K 18.10.02.	P 19.03.01.																
71	3-1-0 - Rákóczi u.	9 nap	P 18.10.26.	P 18.11.09.																
72	3-2-0 - Rákóczi u.	6 nap	Cs 18.10.04.	Cs 18.10.11.																
73	3-3-0 - Bajcsi Zs.u.	12 nap	H 19.02.11.	K 19.02.26.																
74	3-4-0 - Tisza u.	10 nap	Cs 18.12.06.	Sze 18.12.19.																
75	Nyomó vezeték	202 nap	K 18.06.05.	Cs 19.03.14.																
76	NY-1 - Árpád, Petőfi u., külterület.	200 nap	K 18.06.05.	Cs 19.03.14.																
77	NY-2 - Jókai u.	7 nap	Cs 18.10.04.	P 18.10.12.																
78	NY-3 - Rákóczi u.	26 nap	H 18.10.01.	Sze 19.02.20.																
79	Átemelő	64 nap	H 19.03.25.	Cs 19.06.20.																
80	Á-1	44 nap	H 19.03.25.	Cs 19.05.23.																



Műszaki és tervezési ütemterv


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1
81	Építészeti munkák	14 nap	H 19.03.25.	Cs 19.04.11.																
82	Gépészeti munkák	10 nap	P 19.04.12.	Cs 19.04.25.																
83	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	P 19.05.10.	Cs 19.05.23.																
84	Á-2	54 nap	H 19.03.25.	Cs 19.06.06.																
85	Építészeti munkák	14 nap	H 19.03.25.	Cs 19.04.11.																
86	Gépészeti munkák	10 nap	P 19.04.26.	Cs 19.05.09.																
87	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	P 19.05.24.	Cs 19.06.06.																
88	Á-3	64 nap	H 19.03.25.	Cs 19.06.20.																
89	Építészeti munkák	14 nap	H 19.03.25.	Cs 19.04.11.																
90	Gépészeti munkák	10 nap	P 19.04.12.	Cs 19.04.25.																
91	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	P 19.06.07.	Cs 19.06.20.																
92	Telep	415 nap	Sze 19.03.20.	K 20.10.20.																
93	Kivitelezési munkák	275 nap	Sze 19.03.20.	K 20.04.07.																
94	Bontás	20 nap	Sze 20.09.23.	K 20.10.20.																
95	Próbaüzem	180 nap	Sze 20.04.08.	V 20.10.04.																
96	Aranyosapáti	611 nap	K 18.06.12.	Sze 20.10.14.																
97	Hálózat helyreállítással	483 nap	K 18.06.12.	P 20.04.17.																
98	Gravitációs vezeték	483 nap	K 18.06.12.	P 20.04.17.																
99	1-0-0 - Kossuth u.	80 nap	H 18.06.18.	P 18.10.05.																
100	1-1-0 - Kossuth u.	40 nap	H 19.02.11.	P 19.04.05.																
101	1-1-1 - Kossuth u.	30 nap	H 19.04.08.	P 19.05.17.																
102	1-2-0 - Bocskai u.	5 nap	P 18.08.24.	Cs 18.08.30.																
103	2-0-0 - Esze Tamás	52 nap	H 18.09.17.	Cs 18.11.29.																
104	2-1-0 - Vasút u.	40 nap	Cs 19.03.07.	Sze 19.05.01.																
105	2-1-1 - Vasút u.	30 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.06.12.																
106	2-1-2 - Bercsényi u.	30 nap	Cs 19.06.13.	Sze 19.07.24.																
107	2-1-3 - Hunyadi u.	30 nap	Cs 19.07.25.	Sze 19.09.04.																
108	2-1-3-1 - Vasút u.	30 nap	Cs 19.09.05.	Sze 19.10.16.																
109	2-2-0 - Kossuth u.	30 nap	Cs 19.10.17.	Sze 19.11.27.																
110	2-3-0 - Petőfi u.	30 nap	H 19.12.16.	P 20.01.24.																
111	2-3-1 - Petőfi u.	30 nap	H 20.01.27.	P 20.03.06.																
112	2-4-0 - Bajcsi Zs.	30 nap	H 20.03.09.	P 20.04.17.																
113	3-0-0 - Honvéd u.	280 nap	K 18.06.12.	K 19.07.09.																
114	3-1-0 - Béke u.	2 nap	P 18.06.22.	H 18.06.25.																
115	3-2-0 - Lenin u.	30 nap	H 19.02.11.	P 19.03.22.																
116	4-0-0 - Petőfi u., József A.	27 nap	K 18.10.09.	K 18.11.20.																
117	4-1-0 - József A.u.	50 nap	K 19.01.29.	H 19.04.08.																
118	4-2-0 - József, Arany u.	70 nap	H 18.09.03.	Sze 18.12.12.																
119	4-2-1 - Arany J. u.	4 nap	Cs 18.06.21.	K 18.06.26.																
120	4-2-2 - Kölcsey u.	4 nap	H 18.09.17.	Cs 18.09.20.																

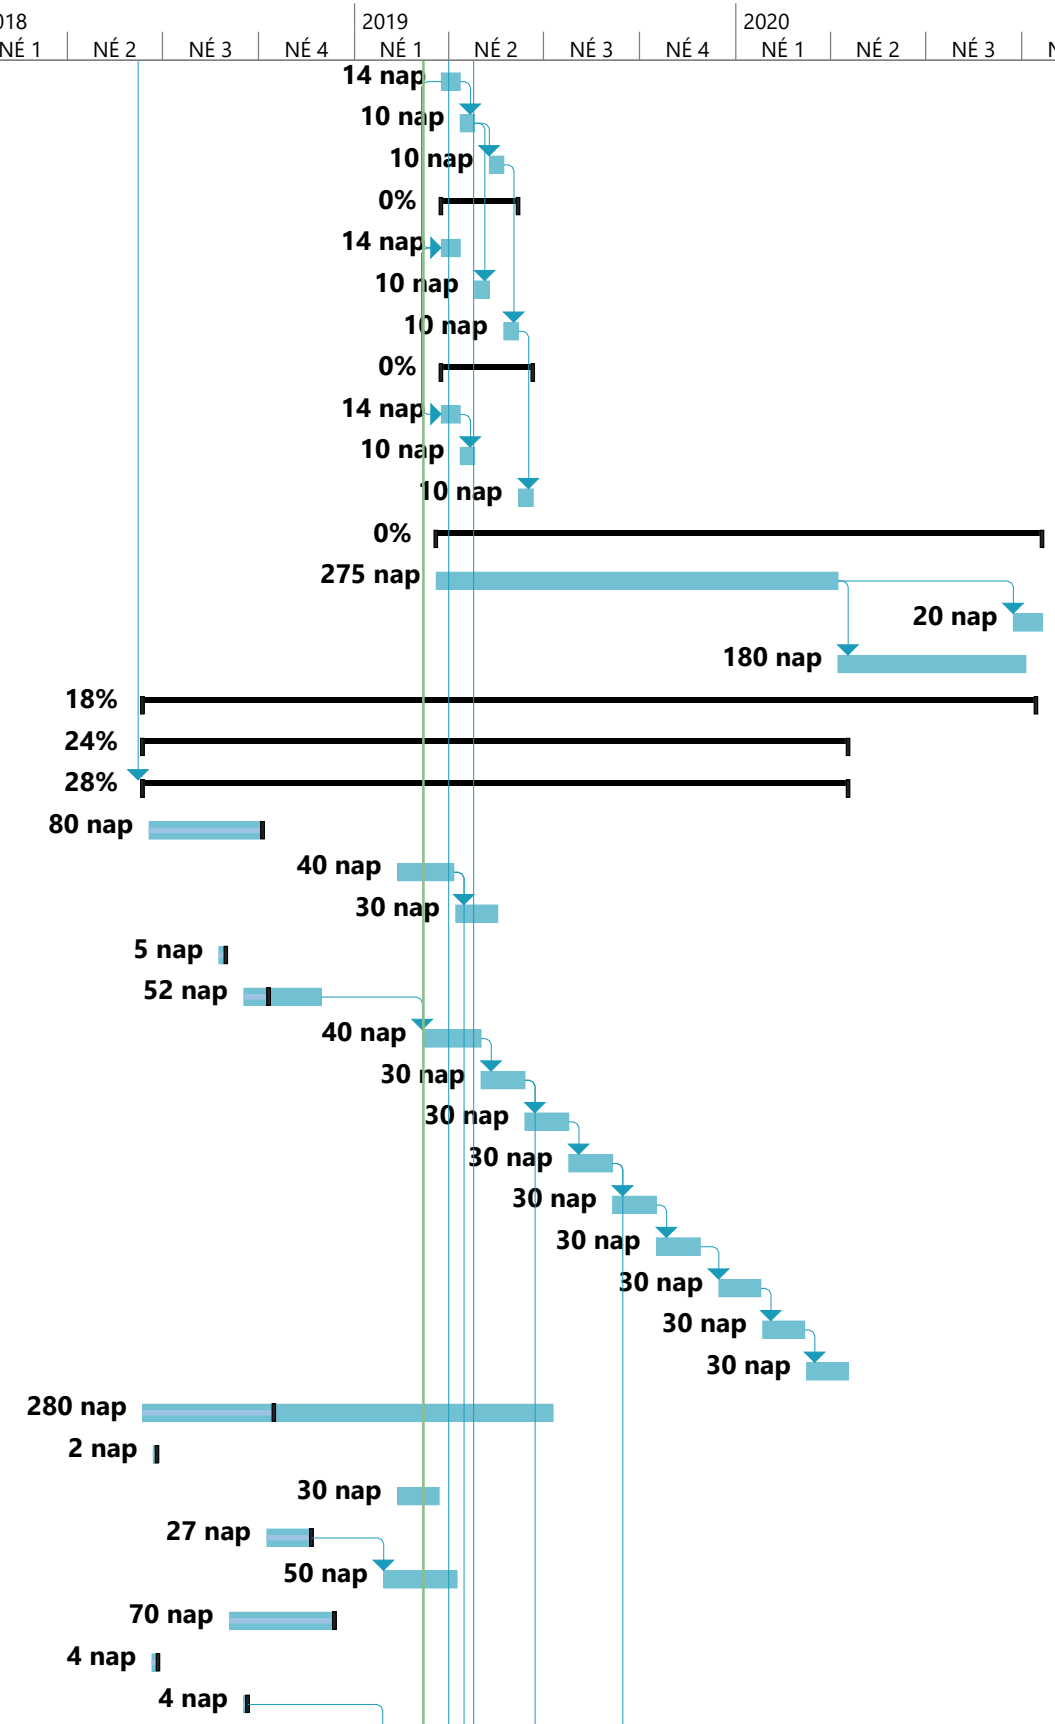



Műszaki és tervezési ütemterv


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021		
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1			
160	M-3-0-0 Vasút u.	10 nap	Cs 18.08.09.	Cs 18.08.23.															
161	M-5-0-0 Temető u.	17 nap	Cs 18.08.30.	P 18.09.21.															
162	M-5-1-0 Rakevszki u.	9 nap	P 18.08.31.	Sze 18.09.12.															
163	M-6-0-0 Bem József, Kossuth Lajos u.	21 nap	H 18.10.01.	Sze 18.10.31.															
164	M-6-1-0 Lehel u.	15 nap	K 18.10.02.	Sze 18.10.24.															
165	M-8-0-0 József Attila, Kossuth Lajos u.	25 nap	Cs 18.11.15.	Sze 18.12.19.															
166	M-8-1-0 Kossuth Lajos u.	3 nap	Cs 18.12.20.	H 18.12.24.															
167	M-9-0-0 Vörösmarty Mihály u.	12 nap	K 18.07.03.	Sze 18.07.18.															
168	M-9-1-0 Gorkij u.	18 nap	P 18.07.06.	K 18.07.31.															
169	M-10-0-0 Jókai Mór, Akácfa u.	12 nap	H 18.07.02.	K 18.07.17.															
170	M-10-1-0 Jókai Mór u.	2 nap	Cs 18.07.05.	P 18.07.06.															
171	M-11-0-0 Uzsoki u.	13 nap	Cs 18.08.09.	K 18.08.28.															
172	M-12-0-0 Rakevszki u., Kis köz	16 nap	Cs 18.08.23.	Cs 18.09.13.															
173	M-12-1-0 Rakevszki u.	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.															
174	II. ütem	307 nap	P 19.02.15.	H 20.04.20.															
175	Gravitációs vezeték	260 nap	P 19.02.15.	Cs 20.02.13.															
176	1-0-0 Vasvári Pál u.	5 nap	Sze 19.11.06.	K 19.11.12.															
177	1-0-0 Halász u.	3 nap	Sze 19.11.13.	P 19.11.15.															
178	1-1-0 Vasvári Pál u.	8 nap	H 19.11.18.	Sze 19.11.27.															
179	1-1-0 Toldi Miklós u.	13 nap	Cs 19.11.28.	H 19.12.16.															
180	1-1-1 Toldi Miklós u.	5 nap	K 19.12.17.	H 19.12.23.															
181	1-1-2 Arany János u.	5 nap	K 19.12.24.	H 19.12.30.															
182	1-2-0 Halász u.	7 nap	K 19.12.31.	Sze 20.01.08.															
183	2-0-0 Rákóczi Ferenc u.	4 nap	Cs 20.01.09.	K 20.01.14.															
184	2-0-0 Arany János u.	8 nap	Sze 20.01.15.	P 20.01.24.															
185	2-1-0 Rákóczi Ferenc u.	3 nap	H 20.01.27.	Sze 20.01.29.															
186	3-0-0 Fertő u.	10 nap	Sze 19.07.03.	K 19.07.16.															
187	3-1-0 Fertő u.	3 nap	Sze 19.07.17.	P 19.07.19.															
188	3-1-0 Kossuth u.	5 nap	Sze 19.07.17.	K 19.07.23.															
189	4-0-0 Kossuth u.	6 nap	H 19.05.27.	H 19.06.03.															
190	4-1-0 Kossuth u.	6 nap	K 19.06.04.	K 19.06.11.															
191	M-4-0-0 Báthory u.	1 nap	Sze 20.01.15.	Sze 20.01.15.															
192	M-4-0-0 Arany János u.	18 nap	Cs 20.01.16.	H 20.02.10.															
193	M-4-1-0 Báthory u.	3 nap	K 20.02.11.	Cs 20.02.13.															
194	5-0-0 Bem József u.	14 nap	Cs 19.04.25.	K 19.05.14.															
195	5-1-0 Bem József u.	8 nap	Sze 19.05.15.	P 19.05.24.															
196	6-0-0 Major u.	3 nap	Sze 19.03.27.	P 19.03.29.															
197	6-0-0 Lehel u.	15 nap	Sze 19.03.06.	K 19.03.26.															
198	6-1-0 Major u.	13 nap	P 19.02.15.	K 19.03.05.															
199	6-1-0 Ady Endre u.	21 nap	Sze 19.03.27.	Sze 19.04.24.															

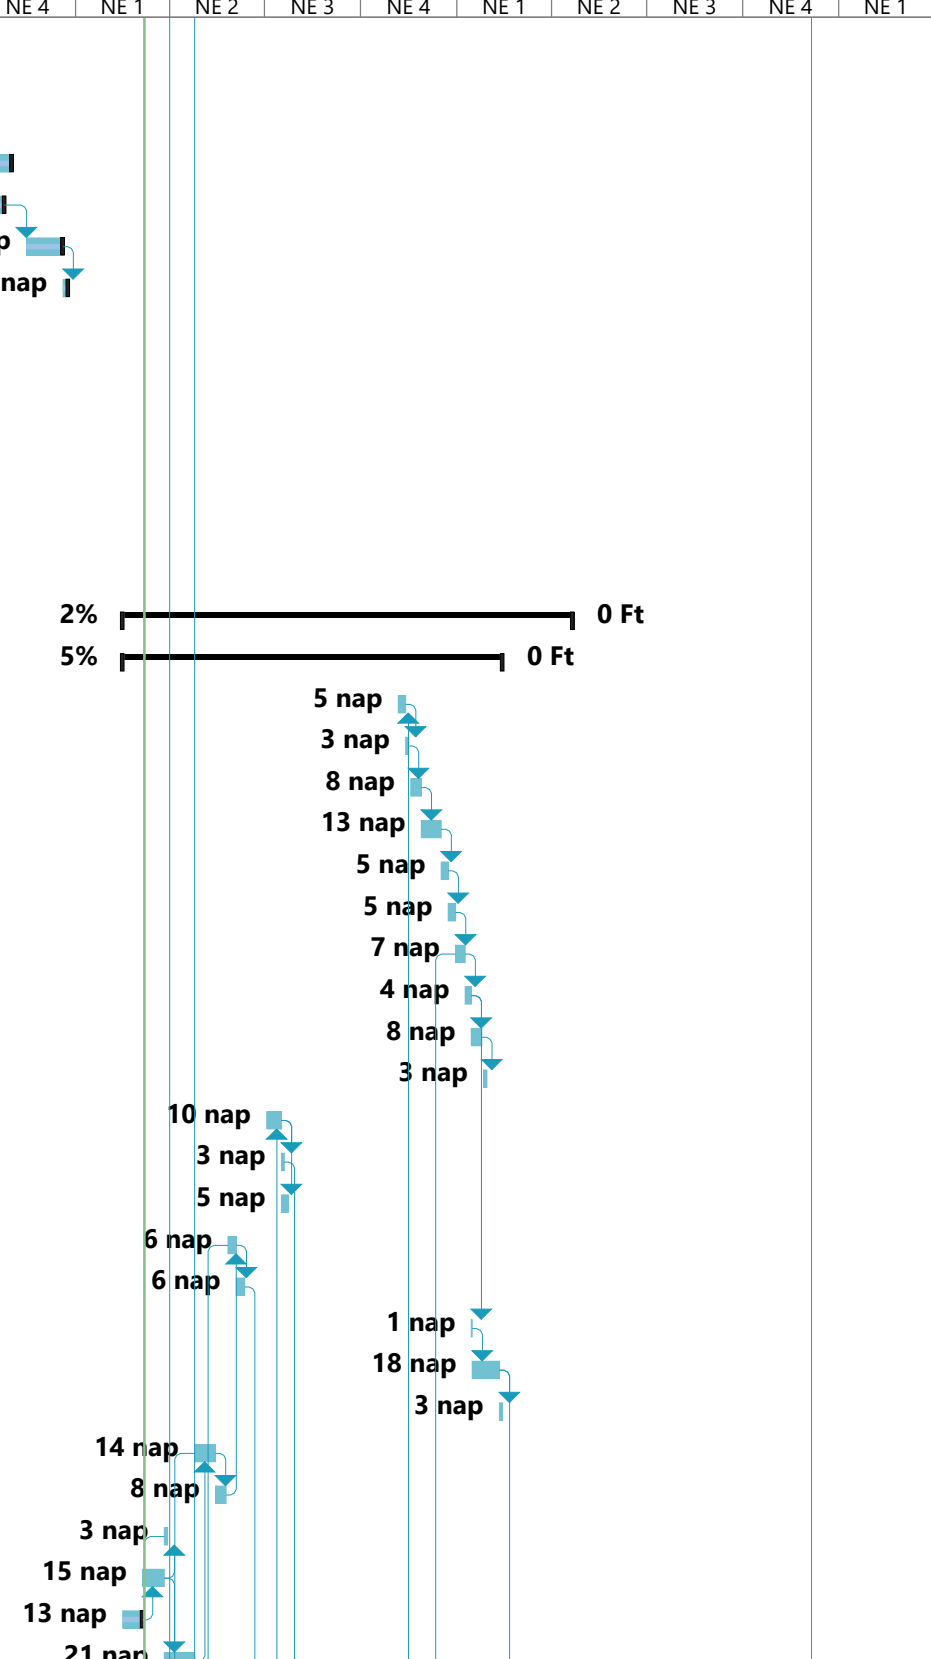



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021				
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	
200	7-0-0 Tisza u.	4 nap	H 19.07.29.	Cs 19.08.01.																	
201	7-1-0 Tisza u.	3 nap	Sze 19.07.24.	P 19.07.26.																	
202	M-7/a-0-0 Petőfi Sándor u.	2 nap	H 19.07.22.	K 19.07.23.																	
203	8-0-0 Tisza u.	16 nap	P 19.08.16.	P 19.09.06.																	
204	8-1-0 Tisza u.	10 nap	P 19.08.02.	Cs 19.08.15.																	
205	8-2-0 Kovács Mihály u.	8 nap	P 19.08.16.	K 19.08.27.																	
206	9-0-0 Báthori u.	8 nap	P 19.10.25.	K 19.11.05.																	
207	9-0-0 Honvéd u.	6 nap	Cs 19.10.17.	Cs 19.10.24.																	
208	9-1-0 Báthori u.	4 nap	P 19.10.11.	Sze 19.10.16.																	
209	10-0-0 Báthori u.	14 nap	H 19.09.16.	Cs 19.10.03.																	
210	10-1-0 Báthori u.	5 nap	P 19.10.04.	Cs 19.10.10.																	
211	11-0-0 Lónyai u.	5 nap	H 19.09.09.	P 19.09.13.																	
212	11-1-0 Lónyai u.	0 nap	P 19.09.13.	P 19.09.13.																	
213	12-0-0 Móricz Zsigmond u.	9 nap	Cs 19.06.20.	K 19.07.02.																	
214	13-0-0 Rakovszki u.	6 nap	Sze 19.06.12.	Sze 19.06.19.																	
215	Nyomó vezeték	279 nap	Sze 19.03.27.	H 20.04.20.																	
216	NY-1	15 nap	P 19.10.25.	Cs 19.11.14.																	
217	NY-2	6 nap	K 19.12.31.	K 20.01.07.																	
218	NY-3	15 nap	Cs 19.06.20.	Sze 19.07.10.																	
219	NY-4	4 nap	H 19.05.27.	Cs 19.05.30.																	
220	NY-5	10 nap	Cs 19.04.25.	Sze 19.05.08.																	
221	NY-6	12 nap	Sze 19.03.27.	Cs 19.04.11.																	
222	NY-7	7 nap	Sze 19.07.24.	Cs 19.08.01.																	
223	NY-8	12 nap	P 19.08.16.	H 19.09.02.																	
224	NY-9	4 nap	P 19.10.11.	Sze 19.10.16.																	
225	NY-10	8 nap	H 19.09.16.	Sze 19.09.25.																	
226	NY-11	5 nap	H 19.09.16.	P 19.09.20.																	
227	NY-12	10 nap	Cs 19.06.20.	Sze 19.07.03.																	
228	NY-13	5 nap	Sze 19.06.12.	K 19.06.18.																	
229	NYG-1	50 nap	K 20.02.11.	H 20.04.20.																	
230	Átemelők	210 nap	H 19.04.08.	P 20.01.24.																	
231	Telep	408 nap	H 19.03.25.	Sze 20.10.14.																	
232	Kivitelezési munkák	280 nap	H 19.03.25.	P 20.04.17.																	
233	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.04.18.	Sze 20.10.14.																	
234	Tiszatelek-Beszterec-Újdombrád	516 nap	P 18.11.02.	Sze 20.10.21.																	
235	<u>Tiszatelek - Hálózat helyreállítással</u>	420 nap	P 19.03.01.	Cs 20.10.08.																	
236	Beszterec - Hálózat helyreállítással	211 nap	P 18.11.30.	Cs 19.09.19.																	
237	Gravitációs vezeték	157 nap	P 18.11.30.	P 19.07.05.																	
238	1-0-0 Kossuth u.	24 nap	K 19.04.23.	P 19.05.24.																	
239	1-1-0 Árpád u.	30 nap	H 19.05.27.	P 19.07.05.																	

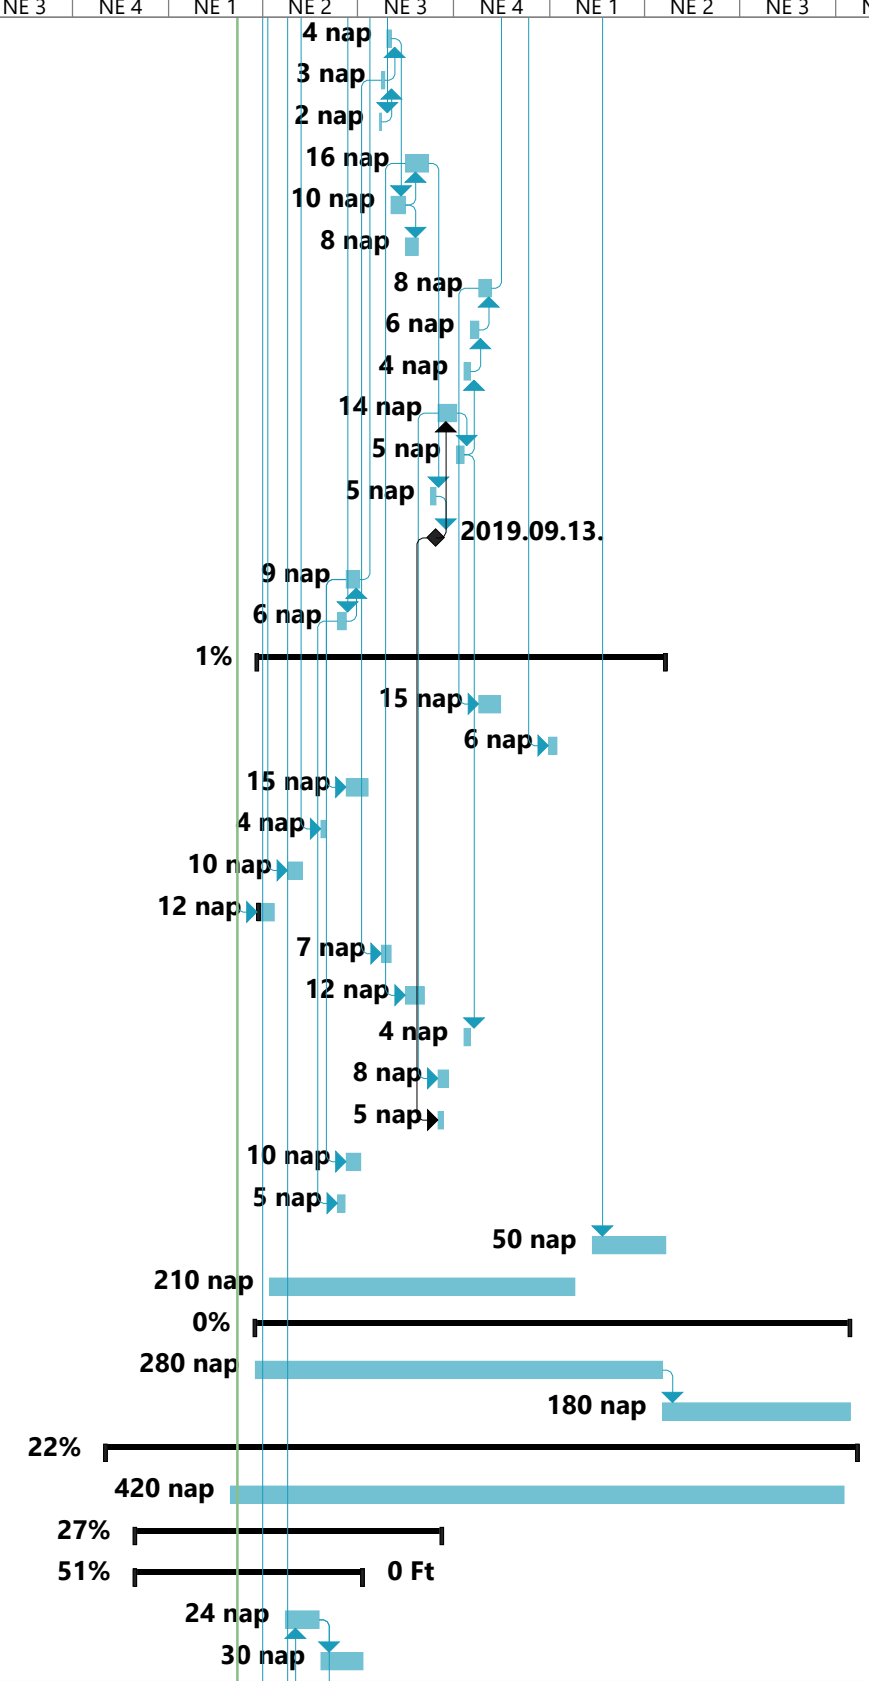



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2
240	1-2-0 Arany J.u	31 nap	H 19.02.11.					31 nap									
241	1-3-0 Kossuth u.	3 nap	K 19.03.26.					3 nap									
242	2-0-0 Petőfi S.	42 nap	P 19.03.29.					42 nap									
243	2-1-0 József A.u	54 nap	H 18.12.03.					54 nap									
244	2-1-1 Dózsa Gy.u	46 nap	H 18.12.03.					46 nap									
245	2-1-1-1 Új u.	5 nap	P 18.11.30.					5 nap									
246	2-2-0 Petőfi S. u	27 nap	Cs 19.01.17.					27 nap									
247	2-3-0 910 hrsz	3 nap	H 19.03.25.					3 nap									
248	2-4-0 Petőfi S.u	2 nap	Cs 19.03.28.					2 nap									
249	2-4-0 366 hrsz	4 nap	H 19.04.01.					4 nap									
250	3-0-0 Táncsics M. u.	41 nap	Szo 18.12.15.					41 nap									
251	3-1-0 Széchenyi u.	8 nap	Sze 19.02.06.					8 nap									
252	4-0-0 Kossuth u.	18 nap	H 19.03.18.					18 nap									
253	4-1-0 Kossuth u.	8 nap	Cs 19.04.11.					8 nap									
254	Nyomó vezeték	177 nap	P 18.12.14.					21%									
255	NY-1	60 nap	H 19.05.27.					60 nap									
256	NY-2	60 nap	Cs 19.01.17.					60 nap									
257	NY-3	80 nap	P 18.12.14.					80 nap									
258	NY-4	60 nap	H 19.02.18.					60 nap									
259	Átemelő aknák	120 nap	P 19.04.05.					0%									
260	Á-1	60 nap	P 19.04.05.					0%									
261	Építészeti munkák	20 nap	P 19.04.05.					20 nap									
262	Gépészeti munkák	20 nap	P 19.05.03.					20 nap									
263	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 19.05.31.					20 nap									
264	Á-2	60 nap	P 19.05.03.					0%									
265	Építészeti munkák	20 nap	P 19.05.03.					20 nap									
266	Gépészeti munkák	20 nap	P 19.05.31.					20 nap									
267	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 19.06.28.					20 nap									
268	Á-3	60 nap	P 19.05.31.					0%									
269	Építészeti munkák	20 nap	P 19.05.31.					20 nap									
270	Gépészeti munkák	20 nap	P 19.06.28.					20 nap									
271	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 19.07.26.					20 nap									
272	Á-4	60 nap	P 19.06.28.					0%									
273	Építészeti munkák	20 nap	P 19.06.28.					20 nap									
274	Gépészeti munkák	20 nap	P 19.07.26.					20 nap									
275	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 19.08.23.					20 nap									
276	Újdombrád - Hálózat helyreállítással	211 nap	P 18.11.02.					54%									
277	Gravitációs vezeték	115 nap	P 18.11.02.					67%									
278	1-0-0 Fő u.	6 nap	P 19.03.15.					6 nap									
279	1-0-0 József A.u	79 nap	H 18.11.26.					79 nap									



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1
280	1-1-0 Virág u.	18 nap	P 18.11.02.	K 18.11.27.					18 nap											
281	1-1-0 336 sz u	7 nap	H 18.11.19.	K 18.11.27.					7 nap											
282	1-2-0 Szabadság u.	9 nap	K 18.12.11.	Cs 18.12.20.					9 nap											
283	2-0-0 Szabadság u.	9 nap	H 19.03.18.	Cs 19.03.28.					9 nap											
284	2-0-0 Templom u.	25 nap	H 19.02.11.	P 19.03.15.					25 nap											
285	2-0-0 Iskola u.	2 nap	P 19.02.22.	H 19.02.25.					2 nap											
286	2-1-0 Szabadság u.	6 nap	K 19.02.12.	K 19.02.19.					6 nap											
287	2-2-0 Templom u	28 nap	K 19.01.08.	Cs 19.02.14.					28 nap											
288	2-3-0 Iskola u.	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.					6 nap											
289	2-3-0 Napsugár u	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.					6 nap											
290	2-4-0 Templom u	4 nap	K 19.02.05.	P 19.02.08.					4 nap											
291	2-4-0 Fő u.	10 nap	P 19.03.15.	Cs 19.03.28.					10 nap											
292	2-4-1 Dobi u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.					15 nap											
293	2-4-2 Fő u.	2 nap	P 19.03.08.	H 19.03.11.					2 nap											
294	2-5-0 Szabadság u.	5 nap	H 19.02.18.	P 19.02.22.					5 nap											
295	2-5-0 Fő u.	25 nap	H 19.02.25.	P 19.03.29.					25 nap											
296	2-5-1 Fő u.	7 nap	H 19.04.01.	K 19.04.09.					7 nap											
297	2-5-2 Iskola u.	10 nap	P 19.03.01.	Cs 19.03.14.					10 nap											
298	Nyomó vezeték	181 nap	Cs 18.12.13.	Sze 19.08.21.					35%											
299	NY-1	50 nap	Cs 18.12.13.	Sze 19.02.20.					50 nap											
300	NY-2	20 nap	Cs 19.02.14.	Sze 19.03.13.					20 nap											
301	Átemelő	80 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.08.21.					0%											
302	Á-1	60 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.07.24.					0%											
303	Építészeti munkák	20 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.29.					20 nap											
304	Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.05.30.	Sze 19.06.26.					20 nap											
305	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 19.06.27.	Sze 19.07.24.					20 nap											
306	Á-1	60 nap	Cs 19.05.30.	Sze 19.08.21.					0%											
307	Építészeti munkák	20 nap	Cs 19.05.30.	Sze 19.06.26.					20 nap											
308	Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.06.27.	Sze 19.07.24.					20 nap											
309	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 19.07.25.	Sze 19.08.21.					20 nap											
310	<u>Telep</u>	408 nap	H 19.04.01.	Sze 20.10.21.					0%											
311	Kivitelezési munkák	280 nap	H 19.04.01.	P 20.04.24.					280 nap											
312	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.04.25.	Sze 20.10.21.					180 nap											
313	Cigánd-Tiszakarád	393 nap	Cs 19.04.25.	H 20.10.26.					0%											
314	<u>Telep</u>	393 nap	Cs 19.04.25.	H 20.10.26.					0%											
315	Kivitelezési munkák	265 nap	Cs 19.04.25.	Sze 20.04.29.					265 nap											
316	Próbaüzem	180 nap	Cs 20.04.30.	H 20.10.26.					180 nap											
317	Projekt zárása	28 nap	Cs 20.10.29.	Szo 20.12.05.					28 nap											
