




Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	us
1		ÉKMO2 Projekt várható ütemezése	1096 nap	Sze 17.12.06.	Szo 20.12.05.	1096 nap
2		ÉKMO2 projekt lebonyolítás ütemezése		K 17.12.12.	Szo 20.12.05.	40%
3		Munkaterület átadás tervezési munkákra	1 nap	K 17.12.12.	K 17.12.12.	1 nap
4		Tervezési munkák	440 nap	Sze 17.12.13.	Sze 19.08.28.	74%
5		Hálózat	422 nap	Sze 17.12.13.	P 19.08.02.	88%
6		Jánd	67 nap	K 18.01.23.	Sze 18.05.02.	67 nap
7		Aranyosapáti	79 nap	Sze 18.01.17.	H 18.05.14.	79 nap
8		Mándok	377 nap	H 18.02.12.	P 19.08.02.	377 nap
9		Gávavencsellő	165 nap	Sze 17.12.13.	Sze 18.08.08.	165 nap
10		Tiszatelek	220 nap	Sze 17.12.13.	P 18.10.26.	220 nap
11		Beszterec	187 nap	Sze 17.12.13.	H 18.09.10.	187 nap
12		Újdombrád	181 nap	Sze 17.12.13.	P 18.08.31.	181 nap
13		Telep	411 nap	K 18.01.23.	Sze 19.08.28.	61%
14		Cigánd	297 nap	K 18.07.10.	Sze 19.08.28.	297 nap
15		Vásárosnamény-Gergelyiugornya	188 nap	Cs 18.03.08.	Cs 18.12.06.	188 nap
16		Aranyosapáti	225 nap	P 18.01.26.	Sze 18.12.19.	225 nap
17		Mándok	101 nap	K 18.05.29.	H 18.10.29.	101 nap
18		Gávavencsellő	185 nap	Sze 18.01.31.	H 18.10.29.	185 nap
19		Tiszatelek	270 nap	K 18.01.23.	Cs 19.02.14.	270 nap
20		Kiviteli tervek jóváhagyása	379 nap	Sze 18.05.09.	H 19.10.21.	46%
21		Hálózat	379 nap	Sze 18.05.09.	H 19.10.21.	74%
22		Jánd	3 nap	Sze 18.05.09.	P 18.05.11.	3 nap
23		Aranyosapáti	4 nap	K 18.05.15.	P 18.05.18.	4 nap
24		Mándok	1 nap	H 19.10.21.	H 19.10.21.	1 nap
25		Gávavencsellő	1 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.	1 nap
26		Tiszatelek	5 nap	H 18.12.10.	P 18.12.14.	5 nap
27		Beszterec	10 nap	K 18.09.11.	P 18.09.21.	10 nap
28		Újdombrád	10 nap	H 18.09.03.	P 18.09.14.	10 nap
29		Telep	237 nap	K 18.10.16.	Sze 19.09.11.	29%
30		Cigánd	10 nap	Cs 19.08.29.	Sze 19.09.11.	10 nap
31		Vásárosnamény-Gergelyiugornya	10 nap	P 18.12.14.	Sze 18.12.26.	10 nap
32		Aranyosapáti	10 nap	Cs 18.12.20.	Sze 19.01.02.	10 nap
33		Mándok	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.	8 nap
34		Gávavencsellő	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.	8 nap
35		Tiszatelek	10 nap	P 19.02.15.	Cs 19.02.28.	10 nap
36		Munkaterület átadása	386 nap	Sze 18.03.14.	Cs 19.09.12.	92%
37		Hálózat	212 nap	Sze 18.03.14.	H 19.01.14.	100%
38		Jánd	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.	
39		Aranyosapáti	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.	



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Gantt chart visualization with monthly markers (március, január, november, szeptembe) and day labels (V, E, K).											
40		Mándok	1 nap	H 19.01.14.	H 19.01.14.	1 nap											
41		Gávavencsellő	1 nap	Cs 18.06.07.	Cs 18.06.07.	1 nap											
42		Tiszatelek	1 nap	K 18.10.16.	K 18.10.16.	1 nap											
43		Beszterec	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.	1 nap											
44		Újdombrád	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.	1 nap											
45		Telep	232 nap	P 18.10.26.	Cs 19.09.12.	83% 1 nap											
46		Cigánd	1 nap	Cs 19.09.12.	Cs 19.09.12.	1 nap											
47		Vásárosnamény-Gergelyugornya	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.	1 nap											
48		Aranyosapáti	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.	1 nap											
49		Mándok	1 nap	P 18.10.26.	P 18.10.26.	1 nap											
50		Gávavencsellő	1 nap	K 18.12.11.	K 18.12.11.	1 nap											
51		Tiszatelek	1 nap	H 18.11.19.	H 18.11.19.	1 nap											
52		Kivitelezési munkák elkezdése	654 nap	H 18.06.04.	Sze 20.12.02.	34%											
53		Jánd - Vásárosnamény	604 nap	H 18.06.04.	Sze 20.09.23.	38%											
54		Hálózat ideiglenes helyreállítással	520 nap	H 18.06.04.	Cs 20.05.28.	76%											
55		Gravitációs vezeték	194 nap	H 18.06.04.	P 19.03.01.	99%											
56		1-0-0 - Petőfi, Árpád u.	47 nap	H 18.06.04.	K 18.08.07.	47 nap											
57		1-1-0 - Árpád, Rákóczi u.	30 nap	P 18.08.10.	Cs 18.09.20.	30 nap											
58		1-1-1 - Rákóczi u.	3 nap	K 18.09.11.	Cs 18.09.13.	3 nap											
59		1-2-0 - Ady Endre u.	3 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.	3 nap											
60		2-0-0 - Kossuth, Szabadság, Arany u.	56 nap	K 18.07.10.	K 18.09.25.	56 nap											
61		2-1-0 - Jókai u.	7 nap	H 18.11.12.	K 18.11.20.	7 nap											
62		2-2-0 - Jókai, Béke u.	19 nap	K 18.11.13.	P 18.12.07.	19 nap											
63		2-2-1 - Dózsa, Béke	59 nap	H 18.12.10.	Cs 19.02.28.	59 nap											
64		2-2-1-1 - Béke u.	7 nap	P 18.11.30.	H 18.12.10.	7 nap											
65		2-2-2 - Jókai u	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.	3 nap											
66		2-3-0 - 289 hrsz u.	24 nap	Sze 18.10.03.	P 18.11.09.	24 nap											
67		2-4-0 - Kossuth u.	17 nap	H 18.07.09.	K 18.07.31.	17 nap											
68		2-5-0 - Arany J u.	4 nap	K 18.09.04.	P 18.09.07.	4 nap											
69		2-6-0 - Arany, Jókai u.	7 nap	P 18.08.24.	H 18.09.03.	7 nap											
70		3-0-0 - Rákóczi, Tisza, Hunyadi u.	105 nap	K 18.10.02.	P 19.03.01.	105 nap											
71		3-1-0 - Rákóczi u.	9 nap	P 18.10.26.	P 18.11.09.	9 nap											
72		3-2-0 - Rákóczi u.	6 nap	Cs 18.10.04.	Cs 18.10.11.	6 nap											
73		3-3-0 - Bajcsi Zs.u.	12 nap	H 19.02.11.	K 19.02.26.	12 nap											
74		3-4-0 - Tisza u.	10 nap	Cs 18.12.06.	Sze 18.12.19.	10 nap											
75		Nyomó vezeték	227 nap	K 18.06.05.	Cs 19.04.18.	83%											
76		NY-1 - Arpád, Petőfi u., külterület.	225 nap	K 18.06.05.	Cs 19.04.18.	225 nap											
77		NY-2 - Jókai u.	7 nap	Cs 18.10.04.	P 18.10.12.	7 nap											
78		NY-3 - Rákóczi u.	26 nap	H 18.10.01.	Sze 19.02.20.	26 nap											

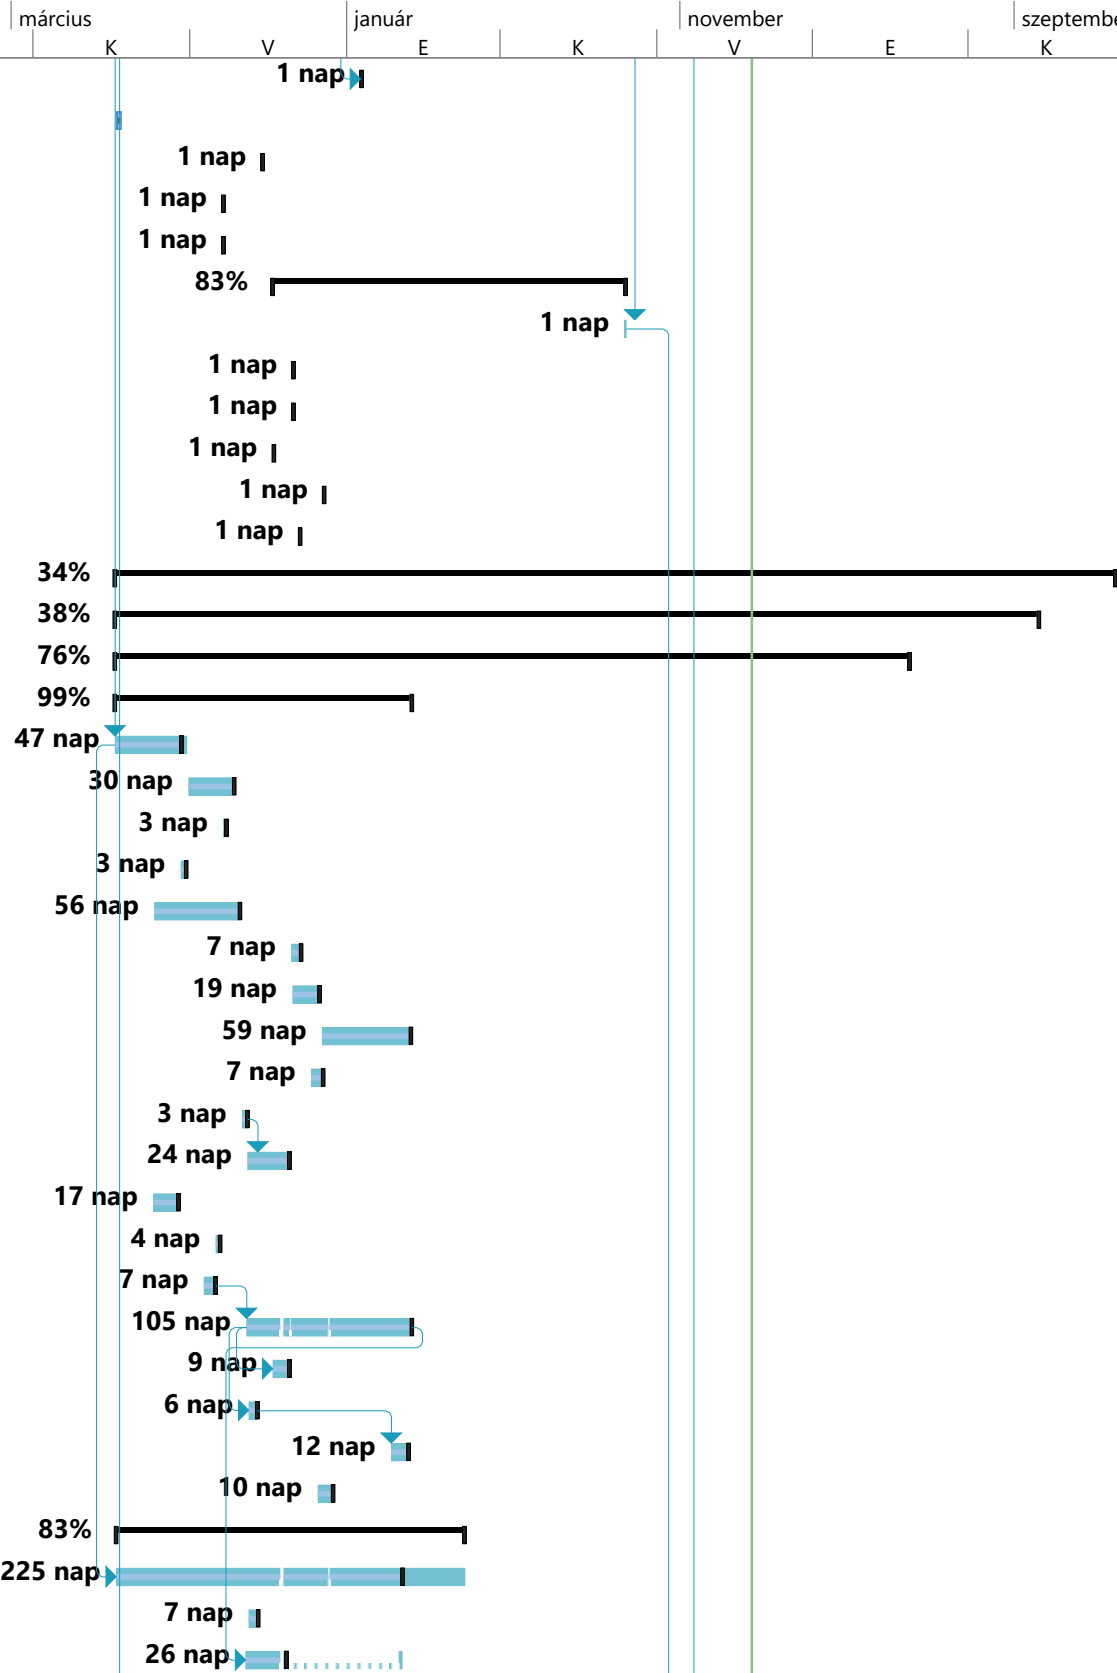



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	usVEmárciusKVKjanuárEKSzeptembe											
79		Végleges helyreállítás	50 nap	P 20.03.20.	Cs 20.05.28.	50 nap											
80		Átemelő	127 nap	Cs 19.10.03.	P 20.03.27.	0%											
81		Á-1	107 nap	Cs 19.10.03.	P 20.02.28.	0%											
82		Építészeti munkák	14 nap	Cs 19.10.03.	K 19.10.22.	14 nap											
83		Gépészeti munkák	10 nap	H 20.01.20.	P 20.01.31.	10 nap											
84		Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	H 20.02.17.	P 20.02.28.	10 nap											
85		Á-2	117 nap	Cs 19.10.03.	P 20.03.13.	0%											
86		Építészeti munkák	14 nap	Cs 19.10.03.	K 19.10.22.	14 nap											
87		Gépészeti munkák	10 nap	H 20.02.03.	P 20.02.14.	10 nap											
88		Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	H 20.03.02.	P 20.03.13.	10 nap											
89		Á-3	127 nap	Cs 19.10.03.	P 20.03.27.	0%											
90		Építészeti munkák	14 nap	Cs 19.10.03.	K 19.10.22.	14 nap											
91		Gépészeti munkák	10 nap	Sze 19.10.23.	K 19.11.05.	10 nap											
92		Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	H 20.03.16.	P 20.03.27.	10 nap											
93		Telep	349 nap	H 19.05.27.	Sze 20.09.23.	0%											
94		Szociális és kezelő épület építése	174 nap	Sze 19.06.05.	P 20.01.31.	110 nap											
95		I. Reaktor építése	151 nap	H 19.05.27.	P 19.12.20.	30 nap											
96		II. Reaktor építése	110 nap	P 19.06.21.	Sze 19.11.20.	30 nap											
97		Utóülepítő medence építése	30 nap	H 20.01.06.	P 20.02.14.	30 nap											
98		Fertőtlenítő medence építése	30 nap	H 20.01.06.	P 20.02.14.	10 nap											
99		Iszapstabilizáló-sűrítő építése	30 nap	H 20.01.06.	P 20.02.14.	10 nap											
100		Csurgalékvíz átemelő építése	10 nap	H 20.01.20.	P 20.01.31.	0%											
101		Tisztított szennyvíz átemelő építése	10 nap	H 20.01.20.	P 20.01.31.	20 nap											
102		Egyéb műtárgyak építése	20 nap	H 20.01.20.	P 20.02.14.	30 nap											
103		Vassó tároló, Vízmérőműtárgyak, Osztóakna 1-2, Motorostolózár akna,	20 nap	H 20.01.20.	P 20.02.14.	40 nap											
104		Udvartéri vezetékek, közművek	30 nap	Cs 20.01.16.	Sze 20.02.26.	60 nap											
105		Technológiai gépészeti szerelés	40 nap	Cs 20.01.16.	Sze 20.03.11.	10 nap											
106		Elektromos erős-gyengeáram és irányítástechnikai szerelések	40 nap	Cs 20.01.30.	Sze 20.03.25.	120 nap											
107		Kerítés, térburkolat építés, csapadékvíz-tereprendezés	60 nap	Cs 20.03.05.	Sze 20.05.27.	54%											
108		Üzempróbák	10 nap	Cs 20.03.26.	Sze 20.04.08.	79%											
109		Próbaüzem	120 nap	Cs 20.04.09.	Sze 20.09.23.	94%											
110		Aranyosapáti	581 nap	K 18.06.12.	H 20.08.31.	80 nap											
111		Hálózat ideiglenes helyreállítással	472 nap	K 18.06.12.	K 20.03.31.	8 nap											
112		Gravitációs vezeték	440 nap	K 18.06.12.	P 20.02.14.												
113		1-0-0 - Kossuth u.	80 nap	H 18.06.18.	P 18.10.05.												
114		1-1-0 - Kossuth u.	8 nap	Sze 19.07.10.	P 19.07.19.												





Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	us V E március K V január E K november V E szeptembe K											
115		1-1-1 - Kossuth u.	2 nap	H 19.12.09.	K 19.12.10.							2 nap					
116		1-2-0 - Bocskai u.	5 nap	P 18.08.24.	Cs 18.08.30.							5 nap					
117		2-0-0 - Esze Tamás	337 nap	H 18.09.17.	K 19.12.31.							337 nap					
118		2-1-0 - Vasút u.	152 nap	H 19.06.03.	K 19.12.31.							152 nap					
119		2-1-1 - Vasút u.	27 nap	H 19.06.03.	K 19.07.09.							27 nap					
120		2-1-2 - Bercsényi u.	30 nap	Cs 19.08.01.	Sze 19.09.11.							30 nap					
121		2-1-3 - Hunyadi u.	40 nap	Sze 19.11.27.	K 20.01.21.							40 nap					
122		2-1-3-1 - Vasút u.	2 nap	Cs 19.06.06.	P 19.06.07.							2 nap					
123		2-2-0 - Kossuth u.	34 nap	H 19.06.10.	Cs 19.07.25.							34 nap					
124		2-3-0 - Petőfi u.	43 nap	Sze 19.05.08.	Cs 19.07.04.							43 nap					
125		2-3-1 - Petőfi u.	20 nap	H 19.12.09.	P 20.01.03.							20 nap					
126		2-4-0 - Bajcsi Zs.	30 nap	H 20.01.06.	P 20.02.14.							30 nap					
127		3-0-0 - Honvéd u.	255 nap	K 18.06.12.	H 19.06.03.							255 nap					
128		3-1-0 - Béke u.	2 nap	P 18.06.22.	H 18.06.25.							2 nap					
129		3-2-0 - Lenin u.	30 nap	H 19.02.11.	P 19.03.22.							30 nap					
130		4-0-0 - Petőfi u., József A.	27 nap	K 18.10.09.	K 18.11.20.							27 nap					
131		4-1-0 - József A.u.	37 nap	K 19.04.23.	K 19.06.11.							37 nap					
132		4-2-0 - József, Arany u.	70 nap	H 18.09.03.	Sze 18.12.12.							70 nap					
133		4-2-1 - Arany J. u.	4 nap	Cs 18.06.21.	K 18.06.26.							4 nap					
134		4-2-2 - Kölcsey u.	4 nap	H 18.09.17.	Cs 18.09.20.							4 nap					
135		4-3-0 - Temető u.	10 nap	H 19.04.08.	P 19.04.19.							10 nap					
136		4-4-0 - Táncsics	27 nap	H 19.02.18.	K 19.03.26.							27 nap					
137		4-5-0 - Jókai u.	10 nap	K 19.03.26.	H 19.04.08.							10 nap					
138		Nyomó vezetékek	322 nap	K 18.10.09.	K 19.12.31.							98%					
139		NY-1 - Kossuth u.	20 nap	P 19.07.12.	Cs 19.08.08.							20 nap					
140		NY-2 - Vasút u.	20 nap	P 19.07.26.	Cs 19.08.22.							20 nap					
141		NY-3 - Vasút u.	88 nap	H 19.09.02.	K 19.12.31.							88 nap					
142		NY-4 - József A. u.	45 nap	K 18.10.09.	Cs 18.12.13.							45 nap					
143		Végleges helyreállítás	127 nap	H 19.10.07.	K 20.03.31.							127 nap					
144		Átemelő	366 nap	Sze 18.09.26.	K 20.02.18.							0%					
145		Á-1	103 nap	Cs 19.09.19.	P 20.02.07.							0%					
146		Építészeti munkák	3 nap	Cs 19.09.19.	H 19.09.23.							3 nap					
147		Gépészeti munkák	20 nap	H 19.12.16.	P 20.01.10.							20 nap					
148		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 20.01.13.	P 20.02.07.							20 nap					
149		Á-2	103 nap	H 19.09.16.	K 20.02.04.							0%					
150		Építészeti munkák	3 nap	H 19.09.16.	Sze 19.09.18.							3 nap					
151		Gépészeti munkák	20 nap	Sze 19.12.11.	K 20.01.07.							20 nap					
152		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Sze 20.01.08.	K 20.02.04.							20 nap					
153		Á-3	103 nap	Szo 19.09.28.	K 20.02.18.							0%					



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Gantt chart timeline (months: V, E, március, K, V, január, E, K, november, V, E, K, szeptembe)											
154		Építészeti munkák	3 nap	Szo 19.09.28.	K 19.10.01.	3 nap											
155		Gépészeti munkák	20 nap	Sze 19.12.25.	K 20.01.21.	20 nap											
156		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Sze 20.01.22.	K 20.02.18.	20 nap											
157		Á-4	72 nap	Sze 18.09.26.	P 19.01.04.	0% 2 nap 20 nap 20 nap											
158		Építészeti munkák	2 nap	Sze 18.09.26.	Cs 18.09.27.												
159		Gépészeti munkák	20 nap	K 18.11.13.	H 18.12.10.												
160		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	K 18.12.11.	P 19.01.04.												
161		Telep	347 nap	K 19.05.07.	H 20.08.31.	0%											
162		Föld feltöltés	75 nap	H 19.05.20.	P 19.08.30.	75 nap											
163		Biológiai reaktor építése	61 nap	K 19.05.07.	H 19.07.29.	61 nap											
164		Iszaptároló építése	70 nap	Sze 19.08.14.	H 19.11.18.	70 nap											
165		Utak, járdák, kerítés építése, füvesítés	140 nap	K 19.10.01.	H 20.04.13.	140 nap											
166		Udvartéri vezetékek, műtárgy gépészet, rácsok, korlátok, fedlapok gyártása, szerelése	120 nap	Cs 19.08.01.	K 20.01.14.	120 nap											
167		Műtárgyak építése (csurgalékvíz átemelő, fertőtlenítő medence, tisztított szennyvíz átemelő, szennyvízátemelő, szennyvízmérő akna, ivóvízmérő akna)	59 nap	Sze 19.07.10.	Szo 19.09.28.	59 nap											
168		Kezelőépület építészet gépészet	100 nap	K 19.09.10.	P 20.01.24.	100 nap											
169		Próbaüzem	180 nap	Cs 20.03.05.	H 20.08.31.	180 nap											
170		Mándok	248 nap	Sze 19.11.13.	P 20.10.23.	5% 7%											
171		Hálózat ideiglenes helyreállítással	245 nap	H 19.11.18.	P 20.10.23.	39 nap											
172		1-0-0 Dózsa Gy. út	39 nap	H 20.01.06.	Cs 20.02.27.	6 nap											
173		1-1-0 Dózsa Gy. út	6 nap	P 20.02.28.	P 20.03.06.	2 nap											
174		2-1-0 Nyárfás út	2 nap	H 20.03.09.	K 20.03.10.	6 nap											
175		2-1-1 Táncsics út	6 nap	Sze 20.03.11.	Sze 20.03.18.	18 nap											
176		2-1-2 Arany J. út	18 nap	Cs 20.03.19.	H 20.04.13.	50 nap											
177		2-3-0 Mező út	50 nap	H 19.11.18.	P 20.01.24.	35 nap											
178		2-1-1-1 Bem J. út	35 nap	Sze 20.03.11.	K 20.04.28.	25 nap											
179		3-1-0 Vasvári P. út	25 nap	Sze 20.04.29.	K 20.06.02.	34 nap											
180		4-0-0 Bajcsy Zs. út	34 nap	Sze 20.06.03.	H 20.07.20.	25 nap											
181		5-0-0 Honvéd út	25 nap	K 20.07.21.	H 20.08.24.	7 nap											
182		6-0-0 Ságvári út	35 nap	H 19.11.25.	P 20.01.10.	22 nap											
183		7-0-0 Ady E. út	7 nap	K 20.08.25.	Sze 20.09.02.	15 nap											
184		7-0-1 Petőfi út	22 nap	Cs 20.09.03.	P 20.10.02.												
185		7-2-2 Rákóczi F. út	15 nap	H 20.10.05.	P 20.10.23.												
186		Nyomó vezeték	60 nap	H 19.11.18.	P 20.02.07.	0% 10 nap											
187		NY-1 Dózsa Gy.	10 nap	H 20.01.13.	P 20.01.24.	60 nap											
188		Ny-2 Dózsa, Arany, Táncsics, Nyárfás	60 nap	H 19.11.18.	P 20.02.07.												

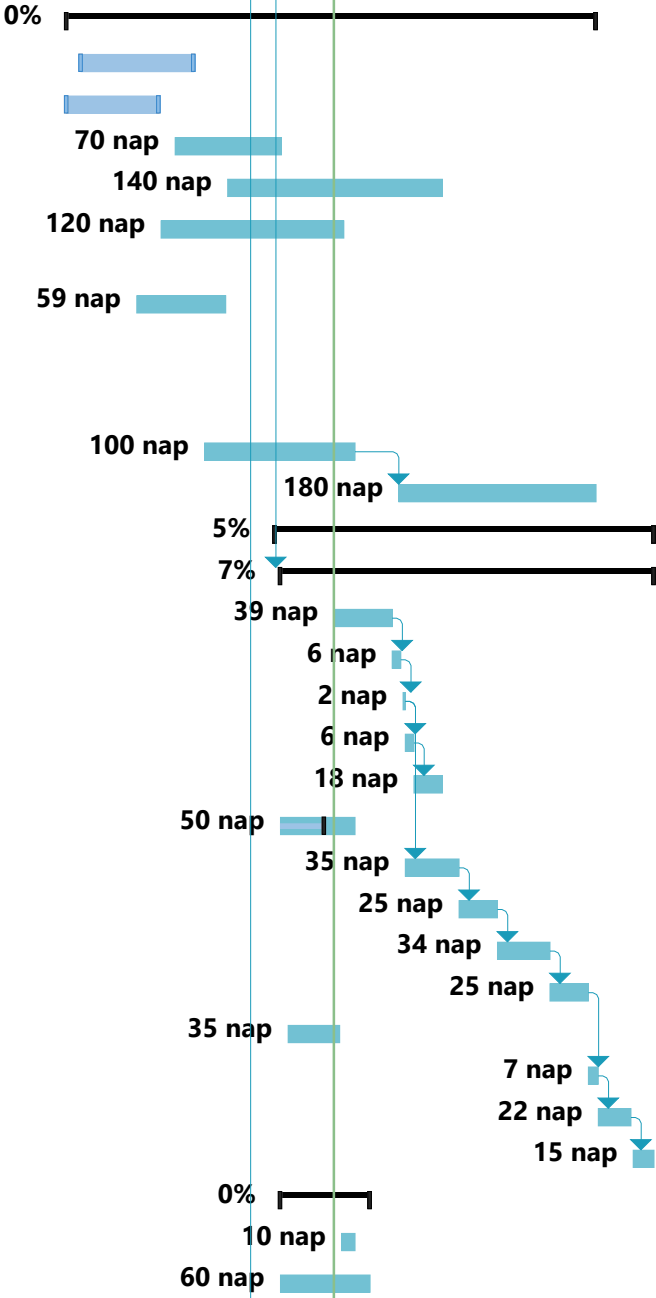



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Gantt chart visualization with monthly markers (március, január, november, szeptembe) and task bars.											
189		Végleges helyreállítás	60 nap	H 20.05.11.	P 20.07.31.	60 nap											
190		Telep	78 nap	Sze 19.11.13.	V 20.03.01.	0%											
191		Kivitelezési munkák	110 nap	Sze 19.11.13.	V 20.03.01.	110 nap											
192		Gávavencsellő	621 nap	H 18.07.02.	P 20.11.13.	21%											
193		Hálózat ideiglenes helyreállítással	511 nap	H 18.07.02.	P 20.06.12.	39%											
194		I. ütem	125 nap	H 18.07.02.	H 18.12.24.	100%											
195		M-1-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	Cs 18.07.12.	H 18.07.30.	13 nap											
196		M-1-1-0 Kolozsvári u.	4 nap	Cs 18.07.19.	K 18.07.24.	4 nap											
197		M-2-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	K 18.07.24.	Cs 18.08.09.	13 nap											
198		M-2-1-0 Árpád u.	6 nap	Sze 18.08.01.	Sze 18.08.08.	6 nap											
199		M-3-0-0 Vasút u.	10 nap	Cs 18.08.09.	Cs 18.08.23.	10 nap											
200		M-5-0-0 Temető u.	17 nap	Cs 18.08.30.	P 18.09.21.	17 nap											
201		M-5-1-0 Rakevszki u.	9 nap	P 18.08.31.	Sze 18.09.12.	9 nap											
202		M-6-0-0 Bem József, Kossuth Lajos u.	21 nap	H 18.10.01.	Sze 18.10.31.	21 nap											
203		M-6-1-0 Lehel u.	15 nap	K 18.10.02.	Sze 18.10.24.	15 nap											
204		M-8-0-0 József Attila, Kossuth Lajos u.	25 nap	Cs 18.11.15.	Sze 18.12.19.	25 nap											
205		M-8-1-0 Kossuth Lajos u.	3 nap	Cs 18.12.20.	H 18.12.24.	3 nap											
206		M-9-0-0 Vörösmarty Mihály u.	12 nap	K 18.07.03.	Sze 18.07.18.	12 nap											
207		M-9-1-0 Gorkij u.	18 nap	P 18.07.06.	K 18.07.31.	18 nap											
208		M-10-0-0 Jókai Mór, Akácfa u.	12 nap	H 18.07.02.	K 18.07.17.	12 nap											
209		M-10-1-0 Jókai Mór u.	2 nap	Cs 18.07.05.	P 18.07.06.	2 nap											
210		M-11-0-0 Uzsoki u.	13 nap	Cs 18.08.09.	K 18.08.28.	13 nap											
211		M-12-0-0 Rakevszki u., Kis köz	16 nap	Cs 18.08.23.	Cs 18.09.13.	16 nap											
212		M-12-1-0 Rakevszki u.	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.	3 nap											
213		II. ütem	348 nap	P 19.02.15.	P 20.06.12.	30%											
214		Gravitációs vezeték	279 nap	P 19.02.15.	H 20.03.09.	80%											
215		1-0-0 Vasvári Pál u.	8 nap	Cs 19.05.23.	H 19.06.03.	8 nap											
216		1-0-0 Halász u.	15 nap	Cs 19.05.23.	Sze 19.06.12.	15 nap											
217		1-1-0 Vasvári Pál u.	11 nap	Cs 19.05.09.	Cs 19.05.23.	11 nap											
218		1-1-0 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.	5 nap											
219		1-1-1 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.	5 nap											
220		1-1-2 Arany János u.	5 nap	Sze 19.04.17.	K 19.04.23.	5 nap											
221		1-2-0 Halász u.	7 nap	Cs 19.05.09.	P 19.05.17.	7 nap											
222		2-0-0 Rákóczi Ferenc u.	4 nap	Szo 19.05.18.	Sze 19.05.22.	4 nap											
223		2-0-0 Arany János u.	8 nap	Cs 19.05.23.	H 19.06.03.	8 nap											
224		2-1-0 Rákóczi Ferenc u.	3 nap	K 19.06.04.	Cs 19.06.06.	3 nap											
225		3-0-0 Fertő u.	16 nap	Sze 19.03.20.	Sze 19.04.10.	16 nap											
226		3-1-0 Fertő u.	3 nap	H 19.04.15.	Sze 19.04.17.	3 nap											
227		3-1-0 Kossuth u.	2 nap	K 19.04.23.	Cs 19.04.25.	2 nap											




Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	usVEmárciusVKVjanuárEKnovemberEszeptembeK											
228		4-0-0 Kossuth u.	6 nap	K 19.03.19.	K 19.03.26.	6 nap											
229		4-1-0 Kossuth u.	9 nap	Sze 19.03.06.	H 19.03.18.	9 nap											
230		M-4-0-0 Báthori u.	1 nap	K 19.08.20.	K 19.08.20.	1 nap											
231		M-4-0-0 Arany János u.	18 nap	H 19.07.22.	Sze 19.08.14.	18 nap											
232		M-4-1-0 Báthory u.	3 nap	Cs 19.08.15.	H 19.08.19.	3 nap											
233		5-0-0 Bem József u.	14 nap	H 19.03.18.	Cs 19.04.04.	14 nap											
234		5-1-0 Bem József u.	8 nap	Cs 19.03.07.	H 19.03.18.	8 nap											
235		6-0-0 Major u.	3 nap	P 19.03.15.	K 19.03.19.	3 nap											
236		6-0-0 Lehel u.	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.	12 nap											
237		6-1-0 Major u.	13 nap	P 19.02.15.	K 19.03.05.	13 nap											
238		6-1-0 Ady Endre u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.	15 nap											
239		7-0-0 Tisza u.	4 nap	K 20.01.07.	P 20.01.10.	4 nap											
240		7-1-0 Tisza u.	3 nap	H 19.11.18.	Sze 19.11.20.	3 nap											
241		M-7/a-0-0 Petőfi Sándor u.	2 nap	H 20.01.20.	K 20.01.21.	2 nap											
242		8-0-0 Tisza u.	16 nap	H 20.01.27.	H 20.02.17.	16 nap											
243		8-1-0 Tisza u.	10 nap	H 20.01.13.	P 20.01.24.	10 nap											
244		8-2-0 Kovács Mihály u.	8 nap	H 20.01.27.	Sze 20.02.05.	8 nap											
245		9-0-0 Báthori u.	10 nap	H 19.08.19.	P 19.08.30.	10 nap											
246		9-0-0 Honvéd u.	6 nap	H 19.08.12.	H 19.08.19.	6 nap											
247		9-1-0 Báthori u.	4 nap	K 19.08.27.	P 19.08.30.	4 nap											
248		10-0-0 Báthori u.	15 nap	K 19.09.03.	H 19.09.23.	15 nap											
249		10-1-0 Báthori u.	13 nap	K 19.09.24.	Sze 19.10.09.	13 nap											
250		11-0-0 Lónyai u.	5 nap	K 20.02.18.	H 20.02.24.	5 nap											
251		11-1-0 Lónyai u.	1 nap	K 20.02.25.	K 20.02.25.	1 nap											
252		12-0-0 Móricz Zsigmond u.	9 nap	Sze 20.02.26.	H 20.03.09.	9 nap											
253		13-0-0 Rakovszki u.	6 nap	Cs 19.03.28.	Cs 19.04.04.	6 nap											
254		Nyomó vezetőék	272 nap	Sze 19.02.27.	K 20.03.10.	76%											
255		NY-1	15 nap	Cs 19.05.09.	Sze 19.05.29.	15 nap											
256		NY-2	6 nap	Sze 19.07.03.	Sze 19.07.10.	6 nap											
257		NY-3	15 nap	P 19.04.05.	Cs 19.04.25.	15 nap											
258		NY-4	4 nap	K 19.03.19.	P 19.03.22.	4 nap											
259		NY-5	10 nap	H 19.03.18.	P 19.03.29.	10 nap											
260		NY-6	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.	12 nap											
261		NY-7	7 nap	Cs 20.01.02.	P 20.01.10.	7 nap											
262		NY-8	12 nap	H 20.01.27.	K 20.02.11.	12 nap											
263		NY-9	4 nap	H 19.09.02.	Cs 19.09.05.	4 nap											
264		NY-10	1 nap	Cs 19.10.10.	Cs 19.10.10.	1 nap											
265		NY-11	5 nap	K 20.02.25.	H 20.03.02.	5 nap											
266		NY-12	10 nap	Sze 20.02.26.	K 20.03.10.	10 nap											



Műszaki és tervezési ütemterv

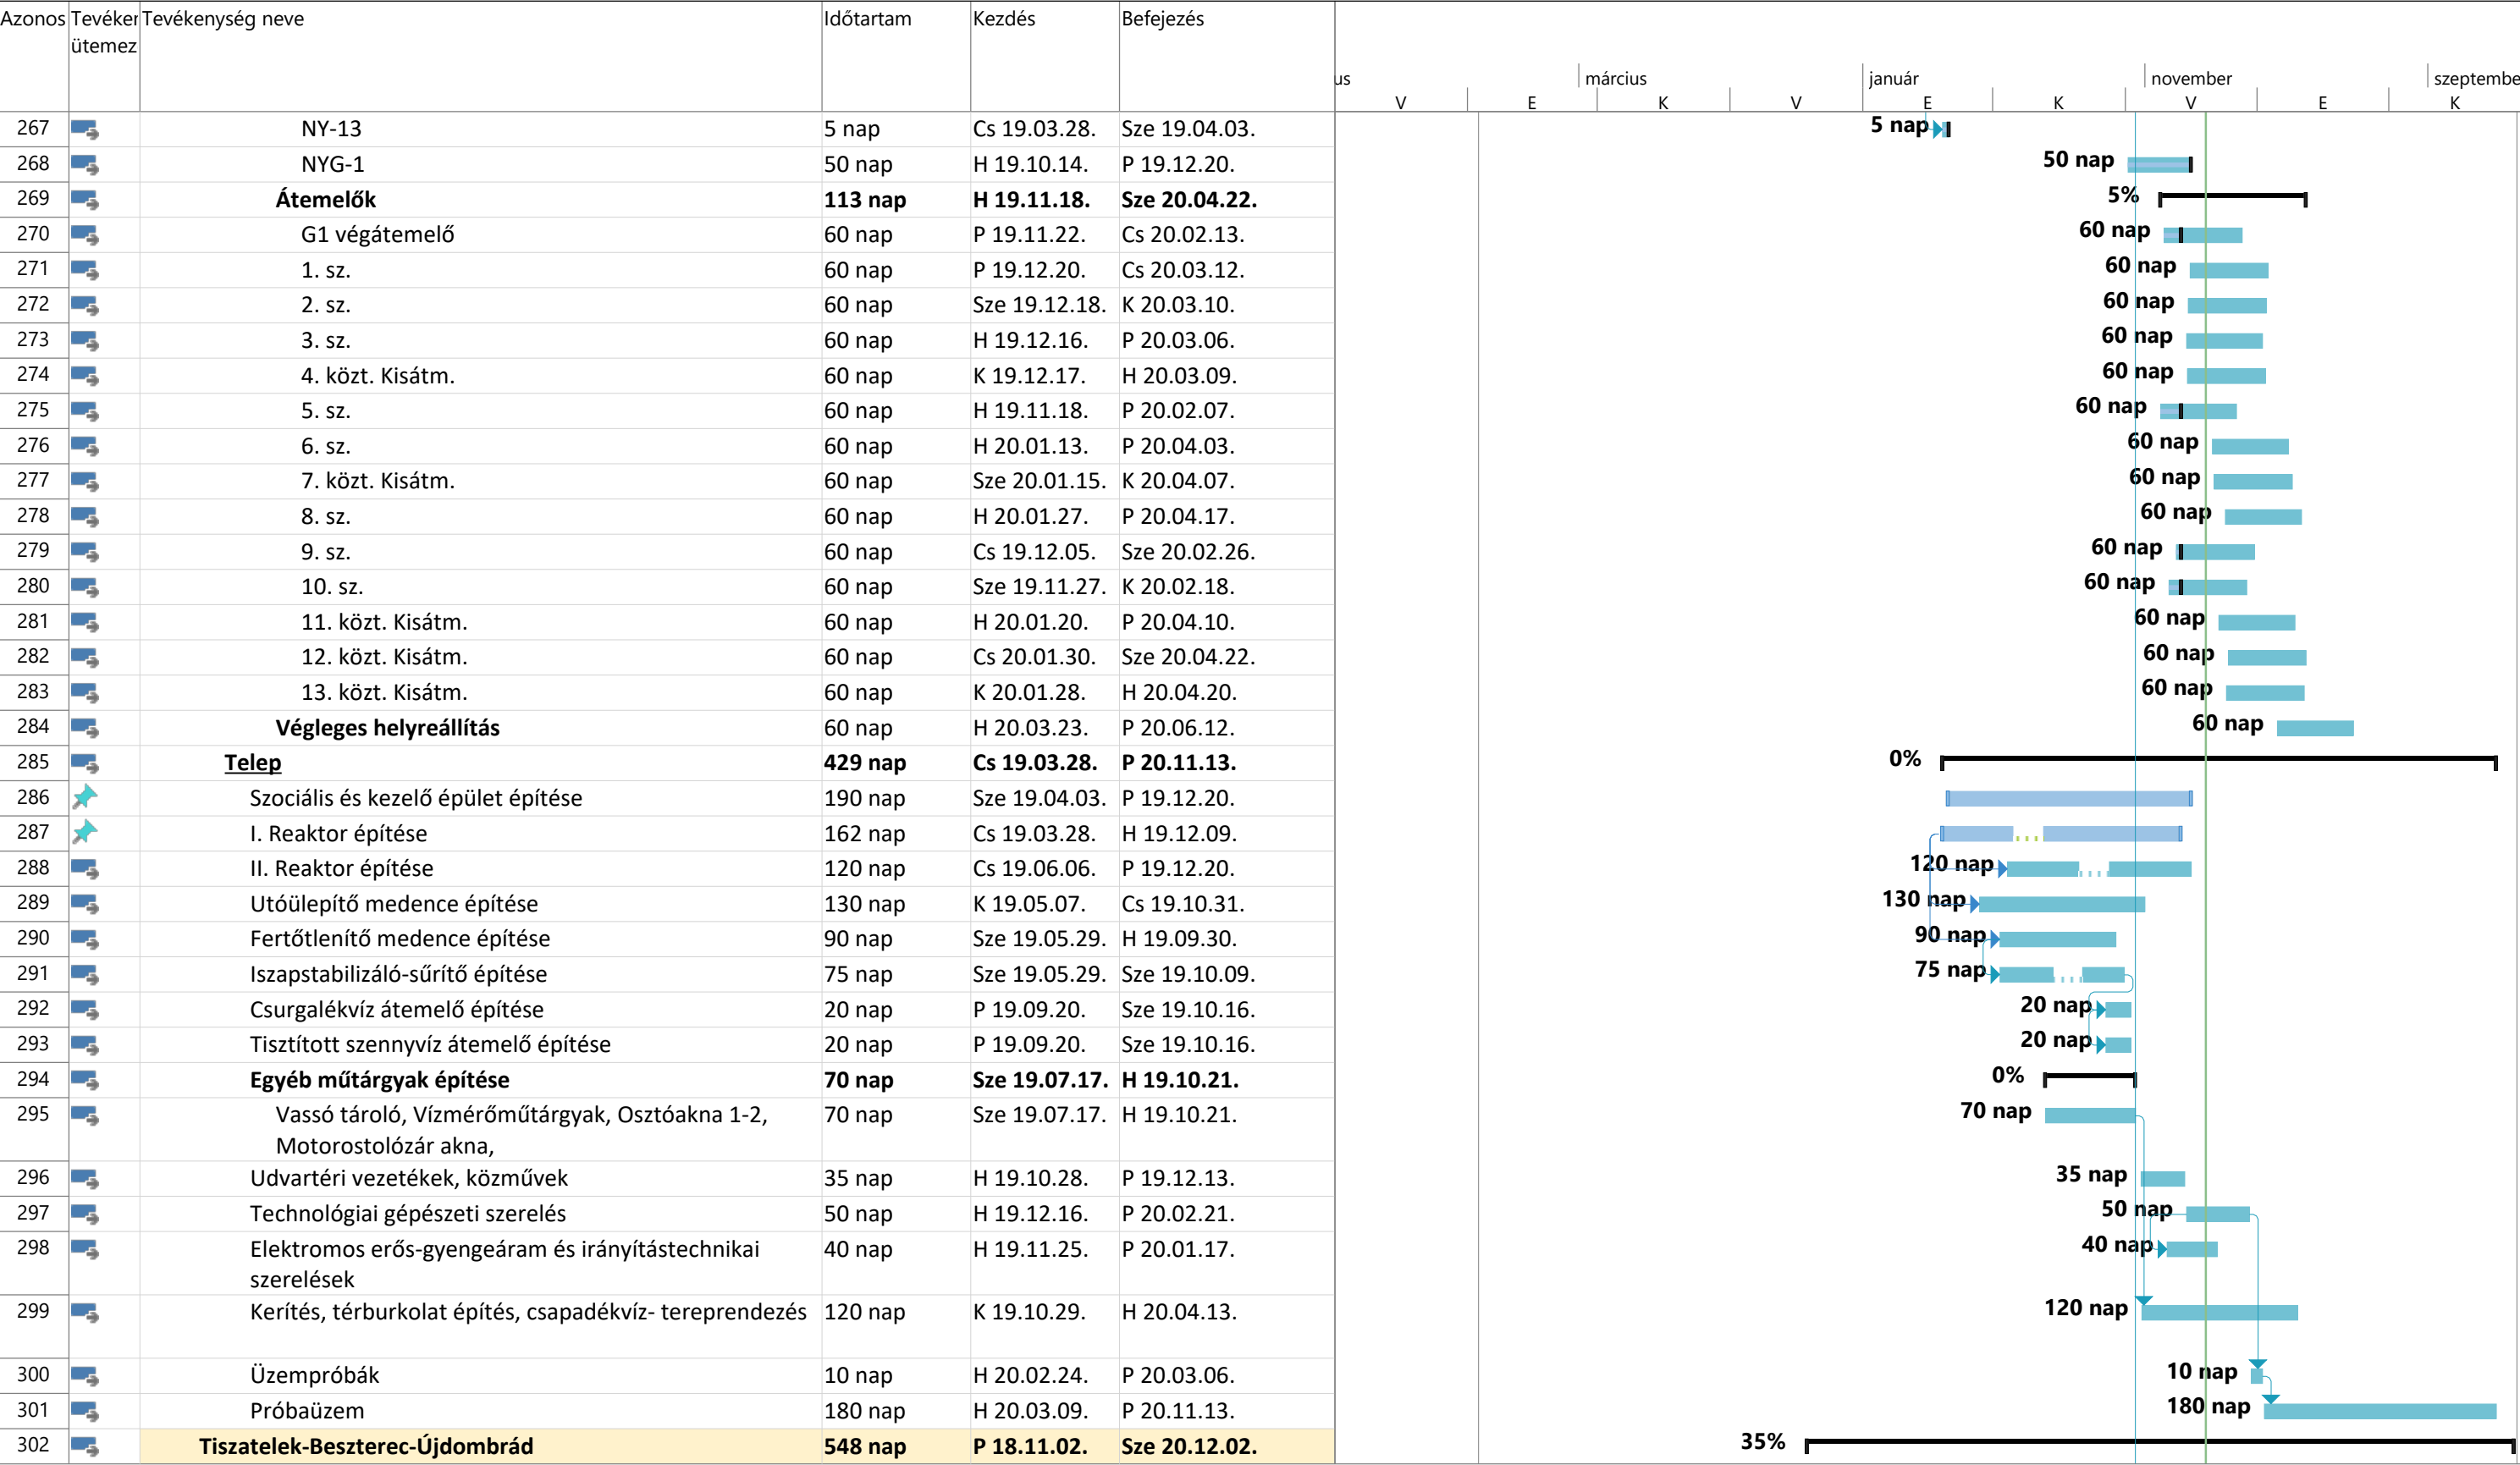



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés												
303		Tiszatelek - Hálózat ideiglenes helyreállítással	447 nap	P 19.02.15.	Cs 20.10.29.												
304		1-0-0 Kossuth u.	20 nap	H 19.07.29.	P 19.08.23.												
305		1/1-0-0 Dózsa Gy.	25 nap	H 19.07.08.	P 19.08.09.												
306		2-0-0 Kossuth u.	70 nap	P 19.05.10.	Cs 19.08.15.												
307		2-1-0 Kossuth, Damjanich, Petőfi u.	40 nap	K 19.05.21.	H 19.07.15.												
308		2-2-0 Damjanich J. u	7 nap	H 20.02.24.	K 20.03.03.												
309		2-3-0 Petőfi u.	7 nap	H 19.09.23.	H 19.09.30.												
310		3-0-0 Kossuth u.	30 nap	H 19.04.22.	P 19.05.31.												
311		3-1-0 Kossuth u.	87 nap	P 19.05.03.	P 19.08.30.												
312		3-2-0 Szántó-K. J. u	8 nap	Sze 19.10.02.	P 19.10.11.												
313		4-0-0 Tanács, Zrínyi Ilona u,	40 nap	Sze 20.02.05.	K 20.03.31.												
314		4-1-0 Zrínyi Ilona u,	11 nap	K 19.11.05.	K 19.11.19.												
315		4-2-0 Tanács u.	8 nap	Sze 19.11.20.	P 19.11.29.												
316		5-0-0 Kossuth u.	6 nap	H 19.12.02.	H 19.12.09.												
317		7-0-0 Árpád, Fürst S. út	16 nap	H 20.02.24.	H 20.03.16.												
318		7-1-0 Fürst S. út	4 nap	K 20.03.17.	P 20.03.20.												
319		7-2-0 József A. u.	9 nap	H 20.03.23.	Cs 20.04.02.												
320		7-3-0 Iskola u	10 nap	P 20.04.03.	Cs 20.04.16.												
321		8-0-0 Arany J.u	15 nap	H 20.03.16.	P 20.04.03.												
322		8-1-0 Árpád, Arany J.u	11 nap	H 20.05.18.	H 20.06.01.												
323		8-1-1 Árpád u.	5 nap	K 20.06.02.	H 20.06.08.												
324		9-0-0 Dózsa Gy.	48 nap	Sze 19.08.21.	Cs 19.10.24.												
325		9-1-0 Dózsa Gy.	36 nap	P 19.09.13.	Cs 19.10.31.												
326		10-0-0 Dózsa Gy.	13 nap	Cs 19.08.08.	H 19.08.26.												
327		10-1-0 Dózsa Gy.	5 nap	P 19.08.09.	Cs 19.08.15.												
328		11-0-0 Esze Tamás u.	3 nap	Cs 20.02.20.	H 20.02.24.												
329		11-0-0 Sallai u.	9 nap	P 19.03.08.	Sze 19.03.20.												
330		11-1-0 Esze Tamás u.	274 nap	Cs 19.03.21.	H 20.05.04.												
331		11-2-0 Esze Tamás u.	271 nap	H 19.03.25.	H 20.05.04.												
332		12-0-0 Rákóczi u.	279 nap	H 19.03.11.	H 20.05.04.												
333		13-0-0 Ady E.u.	10 nap	K 20.05.05.	H 20.05.18.												
334		Nyomó vezetékek	311 nap	P 19.02.15.	Sze 20.04.22.												
335		NY-1	1 nap	H 20.03.02.	H 20.03.02.												
336		NY-1/1	34 nap	Sze 19.07.10.	K 19.10.08.												
337		NY-2	82 nap	H 19.05.20.	K 19.09.10.												
338		NY-3	239 nap	Cs 19.04.04.	H 20.03.02.												
339		NY-4	30 nap	Cs 19.10.17.	Sze 19.11.27.												
340		NY-5	1 nap	P 20.03.20.	P 20.03.20.												
341		NY-6	3 nap	H 20.04.20.	Sze 20.04.22.												



Azonos	Tevékenységek neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Gantt diagram											
342	NY-7	18 nap	K 20.03.17.	Cs 20.04.09.												
343	NY-8	18 nap	H 19.11.04.	Sze 19.11.27.												
344	NY-9	270 nap	P 19.02.15.	Sze 20.02.26.												
345	NY-10	150 nap	Cs 19.08.08.	P 20.03.20.												
346	NY-11	2 nap	H 19.11.11.	K 19.11.12.												
347	NY-12	1 nap	Sze 19.11.13.	Sze 19.11.13.												
348	NY-13	1 nap	Cs 19.11.14.	Cs 19.11.14.												
349	Végleges helyreállítás	50 nap	Sze 20.04.01.	K 20.06.09.												
350	Átemelő aknák	330 nap	H 19.07.29.	Cs 20.10.29.												
351	Á-1	80 nap	Sze 19.08.07.	H 19.11.25.												
352	Á-2	80 nap	H 19.07.29.	Cs 19.11.14.												
353	Á-3	80 nap	H 19.08.05.	Cs 19.11.21.												
354	Á-4	117 nap	H 19.09.02.	H 20.02.10.												
355	Á-5	111 nap	K 19.09.10.	H 20.02.10.												
356	Á-6	10 nap	H 20.06.01.	P 20.06.12.												
357	Á-7	115 nap	Sze 19.09.04.	H 20.02.10.												
358	Á-8	114 nap	Cs 19.09.05.	H 20.02.10.												
359	Á-9	80 nap	H 20.02.03.	P 20.05.22.												
360	Á-10	112 nap	H 19.09.09.	H 20.02.10.												
361	Á-11	80 nap	P 19.11.29.	Cs 20.03.19.												
362	Á-12	80 nap	P 20.03.20.	Cs 20.07.09.												
363	Á-13	80 nap	P 20.07.10.	Cs 20.10.29.												
364	Beszterec - Hálózat ideiglenes helyreállítással	376 nap	P 18.11.30.	K 20.05.05.												
365	Gravitációs vezeték	173 nap	P 18.11.30.	P 19.07.26.												
366	1-0-0 Kossuth u.	63 nap	Cs 19.05.02.	P 19.07.26.												
367	1-1-0 Árpád u.	30 nap	H 19.04.01.	P 19.05.10.												
368	1-2-0 Arany J.u	31 nap	H 19.02.11.	H 19.03.25.												
369	1-3-0 Kossuth u.	2 nap	Cs 19.06.20.	P 19.06.21.												
370	2-0-0 Petőfi S.	63 nap	Cs 19.05.02.	P 19.07.26.												
371	2-1-0 József A.u	54 nap	H 18.12.03.	Cs 19.02.14.												
372	2-1-1 Dózsa Gy.u	46 nap	H 18.12.03.	H 19.02.04.												
373	2-1-1-1 Új u.	5 nap	P 18.11.30.	Cs 18.12.06.												
374	2-2-0 Petőfi S. u	27 nap	Sze 19.04.03.	Cs 19.05.09.												
375	2-3-0 910 hrsz	3 nap	Cs 19.06.06.	H 19.06.10.												
376	2-4-0 Petőfi S.u	2 nap	H 19.05.20.	K 19.05.21.												
377	2-4-0 366 hrsz	4 nap	P 19.05.17.	K 19.05.21.												
378	3-0-0 Táncsics M. u.	41 nap	Szo 18.12.15.	P 19.02.08.												
379	3-1-0 Széchenyi u.	8 nap	Sze 19.02.06.	P 19.02.15.												
380	4-0-0 Kossuth u.	19 nap	H 19.06.17.	Cs 19.07.11.												



Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Gantt diagram showing project schedule from March to September.											
381		4-1-0 Kossuth u.	28 nap	K 19.05.21.	Cs 19.06.27.												
382		Nyomó vezeték	167 nap	P 18.12.14.	Cs 19.08.01.												
383		NY-1	58 nap	H 19.04.29.	Sze 19.07.17.												
384		NY-2	60 nap	Cs 19.01.17.	Sze 19.04.10.												
385		NY-3	98 nap	P 18.12.14.	H 19.04.29.												
386		NY-4	30 nap	P 19.06.21.	Cs 19.08.01.												
387		Végleges helyreállítás	30 nap	Sze 20.03.25.	K 20.05.05.												
388		Átemelő aknák	210 nap	H 19.07.08.	Cs 20.04.23.												
389		Á-1	150 nap	H 19.07.08.	Cs 20.01.30.												
390		Építészeti munkák	20 nap	H 19.07.08.	P 19.08.02.												
391		Gépészeti munkák	20 nap	P 19.12.06.	Cs 20.01.02.												
392		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 20.01.03.	Cs 20.01.30.												
393		Á-2	166 nap	P 19.07.12.	Cs 20.02.27.												
394		Építészeti munkák	20 nap	P 19.07.12.	Cs 19.08.08.												
395		Gépészeti munkák	20 nap	P 20.01.03.	Cs 20.01.30.												
396		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 20.01.31.	Cs 20.02.27.												
397		Á-3	183 nap	Sze 19.07.17.	Cs 20.03.26.												
398		Építészeti munkák	20 nap	Sze 19.07.17.	K 19.08.13.												
399		Gépészeti munkák	20 nap	P 20.01.31.	Cs 20.02.27.												
400		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 20.02.28.	Cs 20.03.26.												
401		Á-4	204 nap	K 19.07.16.	Cs 20.04.23.												
402		Építészeti munkák	20 nap	K 19.07.16.	H 19.08.12.												
403		Gépészeti munkák	20 nap	P 20.02.28.	Cs 20.03.26.												
404		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 20.03.27.	Cs 20.04.23.												
405		Újdombrád - Hálózat ideiglenes helyreállítással	394 nap	P 18.11.02.	Cs 20.04.30.												
406		Gravitációs vezeték	391 nap	P 18.11.02.	H 20.04.27.												
407		1-0-0 Fő u.	6 nap	H 20.03.16.	H 20.03.23.												
408		1-0-0 József A.u	79 nap	H 18.11.26.	Cs 19.03.14.												
409		1-1-0 Virág u.	18 nap	P 18.11.02.	K 18.11.27.												
410		1-1-0 336 sz u	7 nap	H 18.11.19.	K 18.11.27.												
411		1-2-0 Szabadság u.	9 nap	K 18.12.11.	Cs 18.12.20.												
412		2-0-0 Szabadság u.	250 nap	Sze 19.04.17.	P 20.03.27.												
413		2-0-0 Templom u.	25 nap	H 19.02.11.	P 19.03.15.												
414		2-0-0 Iskola u.	2 nap	P 19.02.22.	H 19.02.25.												
415		2-1-0 Szabadság u.	6 nap	K 19.02.12.	K 19.02.19.												
416		2-2-0 Templom u	28 nap	K 19.01.08.	Cs 19.02.14.												
417		2-3-0 Iskola u.	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.												
418		2-3-0 Napsugár u	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.												
419		2-4-0 Templom u	4 nap	K 19.02.05.	P 19.02.08.												



Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Gantt diagram											
420		2-4-0 Fő u.	21 nap	K 20.03.24.	K 20.04.21.	us V E március K V január E K november V E szeptembe 21 nap 15 nap 2 nap 5 nap 25 nap 7 nap 10 nap 100% 50 nap 20 nap 30 nap 0% 0% 20 nap 20 nap 20 nap 0% 20 nap 20 nap 20 nap 0% 226 nap 180 nap 0% 0% 100 nap 180 nap 28 nap											
421		2-4-1 Dobi u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.												
422		2-4-2 Fő u.	2 nap	K 20.03.24.	Sze 20.03.25.												
423		2-5-0 Szabadság u.	5 nap	H 19.02.18.	P 19.02.22.												
424		2-5-0 Fő u.	25 nap	K 20.03.24.	H 20.04.27.												
425		2-5-1 Fő u.	7 nap	K 20.03.24.	Sze 20.04.01.												
426		2-5-2 Iskola u.	10 nap	P 19.03.01.	Cs 19.03.14.												
427		Nyomó vezetőék	66 nap	Cs 18.12.13.	Sze 19.03.13.												
428		NY-1	50 nap	Cs 18.12.13.	Sze 19.02.20.												
429		NY-2	20 nap	Cs 19.02.14.	Sze 19.03.13.												
430		Végleges helyreállítás	30 nap	P 20.03.20.	Cs 20.04.30.												
431		Átemelő	163 nap	K 19.07.23.	Sze 20.03.04.												
432		Á-1	140 nap	P 19.07.26.	Sze 20.02.05.												
433		Építészeti munkák	20 nap	P 19.07.26.	Cs 19.08.22.												
434		Gépészeti munkák	20 nap	Cs 19.12.12.	Sze 20.01.08.												
435		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 20.01.09.	Sze 20.02.05.												
436		Á-1	163 nap	K 19.07.23.	Sze 20.03.04.												
437		Építészeti munkák	20 nap	K 19.07.23.	H 19.08.19.												
438		Gépészeti munkák	20 nap	Cs 20.01.09.	Sze 20.02.05.												
439		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Cs 20.02.06.	Sze 20.03.04.												
440		Telep	469 nap	K 19.02.19.	Sze 20.12.02.												
441		Kivitelezési munkák	226 nap	K 19.02.19.	P 20.06.05.												
442		Próbaüzem	180 nap	Szo 20.06.06.	Sze 20.12.02.												
443		Cigánd-Tiszakarád	229 nap	K 19.10.22.	Szo 20.09.05.												
444		Telep	229 nap	K 19.10.22.	Szo 20.09.05.												
445		Kivitelezési munkák	100 nap	K 19.10.22.	H 20.03.09.												
446		Próbaüzem	180 nap	K 20.03.10.	Szo 20.09.05.												
447		Projekt zárása	28 nap	Cs 20.10.29.	Szo 20.12.05.												

MÉRNÖK
