




Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018																				2019				2020				2021				2022
						N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1									
1	➡	ÉKMO2 Projekt várható ütemezése	1096 nap	Sze 17.12.06.	Szo 20.12.05.	1096 nap																																
2	➡	ÉKMO2 projekt lebonyolítás ütemezése		K 17.12.12.	H 21.11.29.	54%																																
3	➡	Munkaterület átadás tervezési munkákra	1 nap	K 17.12.12.	K 17.12.12.	1 nap																																
4	➡	Tervezési munkák	440 nap	Sze 17.12.13.	Sze 19.08.28.	91%																																
5	➡	Hálózat	422 nap	Sze 17.12.13.	P 19.08.02.	100%																																
6	➡	Jánd	67 nap	K 18.01.23.	Sze 18.05.02.	67 nap																																
7	➡	Aranyosapáti	79 nap	Sze 18.01.17.	H 18.05.14.	79 nap																																
8	➡	Mándok	377 nap	H 18.02.12.	P 19.08.02.	377 nap																																
9	➡	Gávavencsellő	165 nap	Sze 17.12.13.	Sze 18.08.08.	165 nap																																
10	➡	Tiszatelek	220 nap	Sze 17.12.13.	P 18.10.26.	220 nap																																
11	➡	Beszterec	187 nap	Sze 17.12.13.	H 18.09.10.	187 nap																																
12	➡	Újdombrád	181 nap	Sze 17.12.13.	P 18.08.31.	181 nap																																
13	➡	Telep	411 nap	K 18.01.23.	Sze 19.08.28.	82%																																
14	➡	Cigánd	297 nap	K 18.07.10.	Sze 19.08.28.	297 nap																																
15	➡	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	188 nap	Cs 18.03.08.	Cs 18.12.06.	188 nap																																
16	➡	Aranyosapáti	225 nap	P 18.01.26.	Sze 18.12.19.	225 nap																																
17	➡	Mándok	101 nap	K 18.05.29.	H 18.10.29.	101 nap																																
18	➡	Gávavencsellő	185 nap	Sze 18.01.31.	H 18.10.29.	185 nap																																
19	➡	Tiszatelek	270 nap	K 18.01.23.	Cs 19.02.14.	270 nap																																
20	➡	Kiviteli tervek jóváhagyása	379 nap	Sze 18.05.09.	H 19.10.21.	100%																																
21	➡	Hálózat	379 nap	Sze 18.05.09.	H 19.10.21.	100%																																
22	➡	Jánd	3 nap	Sze 18.05.09.	P 18.05.11.	3 nap																																
23	➡	Aranyosapáti	4 nap	K 18.05.15.	P 18.05.18.	4 nap																																
24	➡	Mándok	1 nap	H 19.10.21.	H 19.10.21.	1 nap																																
25	➡	Gávavencsellő	1 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.	1 nap																																
26	➡	Tiszatelek	5 nap	H 18.12.10.	P 18.12.14.	5 nap																																
27	➡	Beszterec	10 nap	K 18.09.11.	P 18.09.21.	10 nap																																
28	➡	Újdombrád	10 nap	H 18.09.03.	P 18.09.14.	10 nap																																
29	➡	Telep	237 nap	K 18.10.16.	Sze 19.09.11.	100%																																
30	➡	Cigánd	10 nap	Cs 19.08.29.	Sze 19.09.11.	10 nap																																
31	➡	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	10 nap	P 18.12.14.	Sze 18.12.26.	10 nap																																
32	➡	Aranyosapáti	10 nap	Cs 18.12.20.	Sze 19.01.02.	10 nap																																
33	➡	Mándok	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.	8 nap																																
34	➡	Gávavencsellő	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.	8 nap																																
35	➡	Tiszatelek	10 nap	P 19.02.15.	Cs 19.02.28.	10 nap																																
36	➡	Munkaterület átadása	386 nap	Sze 18.03.14.	Cs 19.09.12.	100%																																
37	➡	Hálózat	212 nap	Sze 18.03.14.	H 19.01.14.	100%																																
38	➡	Jánd	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.	1 nap																																
39	➡	Aranyosapáti	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.	1 nap																																



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke- r- ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021				2022
						N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	
40		Mándok	1 nap	H 19.01.14.	H 19.01.14.																	
41		Gávavencsellő	1 nap	Cs 18.06.07.	Cs 18.06.07.																	
42		Tiszatelek	1 nap	K 18.10.16.	K 18.10.16.																	
43		Beszterec	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.																	
44		Újdombrád	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.																	
45		Telep	232 nap	P 18.10.26.	Cs 19.09.12.																	
46		Cigánd	1 nap	Cs 19.09.12.	Cs 19.09.12.																	
47		Vásárosnamény-Gergelyiugornya	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.																	
48		Aranyosapáti	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.																	
49		Mándok	1 nap	P 18.10.26.	P 18.10.26.																	
50		Gávavencsellő	1 nap	K 18.12.11.	K 18.12.11.																	
51		Tiszatelek	1 nap	H 18.11.19.	H 18.11.19.																	
52		Kivitelezési munkák elkezdése	913 nap	H 18.06.04.	H 21.11.29.																	
53		Jánd - Vásárosnamény	657 nap	H 18.06.04.	Szo 20.12.05.																	
54		Hálózat ideiglenes helyreállítással	571 nap	H 18.06.04.	P 20.08.07.																	
55		Gravitációs vezeték	194 nap	H 18.06.04.	P 19.03.01.																	
56		1-0-0 - Petőfi, Árpád u.	47 nap	H 18.06.04.	K 18.08.07.																	
57		1-1-0 - Árpád, Rákóczi u.	30 nap	P 18.08.10.	Cs 18.09.20.																	
58		1-1-1 - Rákóczi u.	3 nap	K 18.09.11.	Cs 18.09.13.																	
59		1-2-0 - Ady Endre u.	3 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.																	
60		2-0-0 - Kossuth, Szabadság, Arany u.	56 nap	K 18.07.10.	K 18.09.25.																	
61		2-1-0 - Jókai u.	7 nap	H 18.11.12.	K 18.11.20.																	
62		2-2-0 - Jókai, Béke u.	19 nap	K 18.11.13.	P 18.12.07.																	
63		2-2-1 - Dózsa, Béke	59 nap	H 18.12.10.	Cs 19.02.28.																	
64		2-2-1-1 - Béke u.	7 nap	P 18.11.30.	H 18.12.10.																	
65		2-2-2 - Jókai u	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.																	
66		2-3-0 - 289 hrsz u.	24 nap	Sze 18.10.03.	P 18.11.09.																	
67		2-4-0 - Kossuth u.	17 nap	H 18.07.09.	K 18.07.31.																	
68		2-5-0 - Arany J u.	4 nap	K 18.09.04.	P 18.09.07.																	
69		2-6-0 - Arany, Jókai u.	7 nap	P 18.08.24.	H 18.09.03.																	
70		3-0-0 - Rákóczi, Tisza, Hunyadi u.	105 nap	K 18.10.02.	P 19.03.01.																	
71		3-1-0 - Rákóczi u.	9 nap	P 18.10.26.	P 18.11.09.																	
72		3-2-0 - Rákóczi u.	6 nap	Cs 18.10.04.	Cs 18.10.11.																	
73		3-3-0 - Bajcsi Zs.u.	12 nap	H 19.02.11.	K 19.02.26.																	
74		3-4-0 - Tisza u.	10 nap	Cs 18.12.06.	Sze 18.12.19.																	
75		Nyomó vezeték	227 nap	K 18.06.05.	Cs 19.04.18.																	
76		NY-1 - Arpád, Petőfi u., külterület.	225 nap	K 18.06.05.	Cs 19.04.18.																	
77		NY-2 - Jókai u.	7 nap	Cs 18.10.04.	P 18.10.12.																	
78		NY-3 - Rákóczi u.	34,4 nap	H 18.10.01.	H 19.03.04.																	

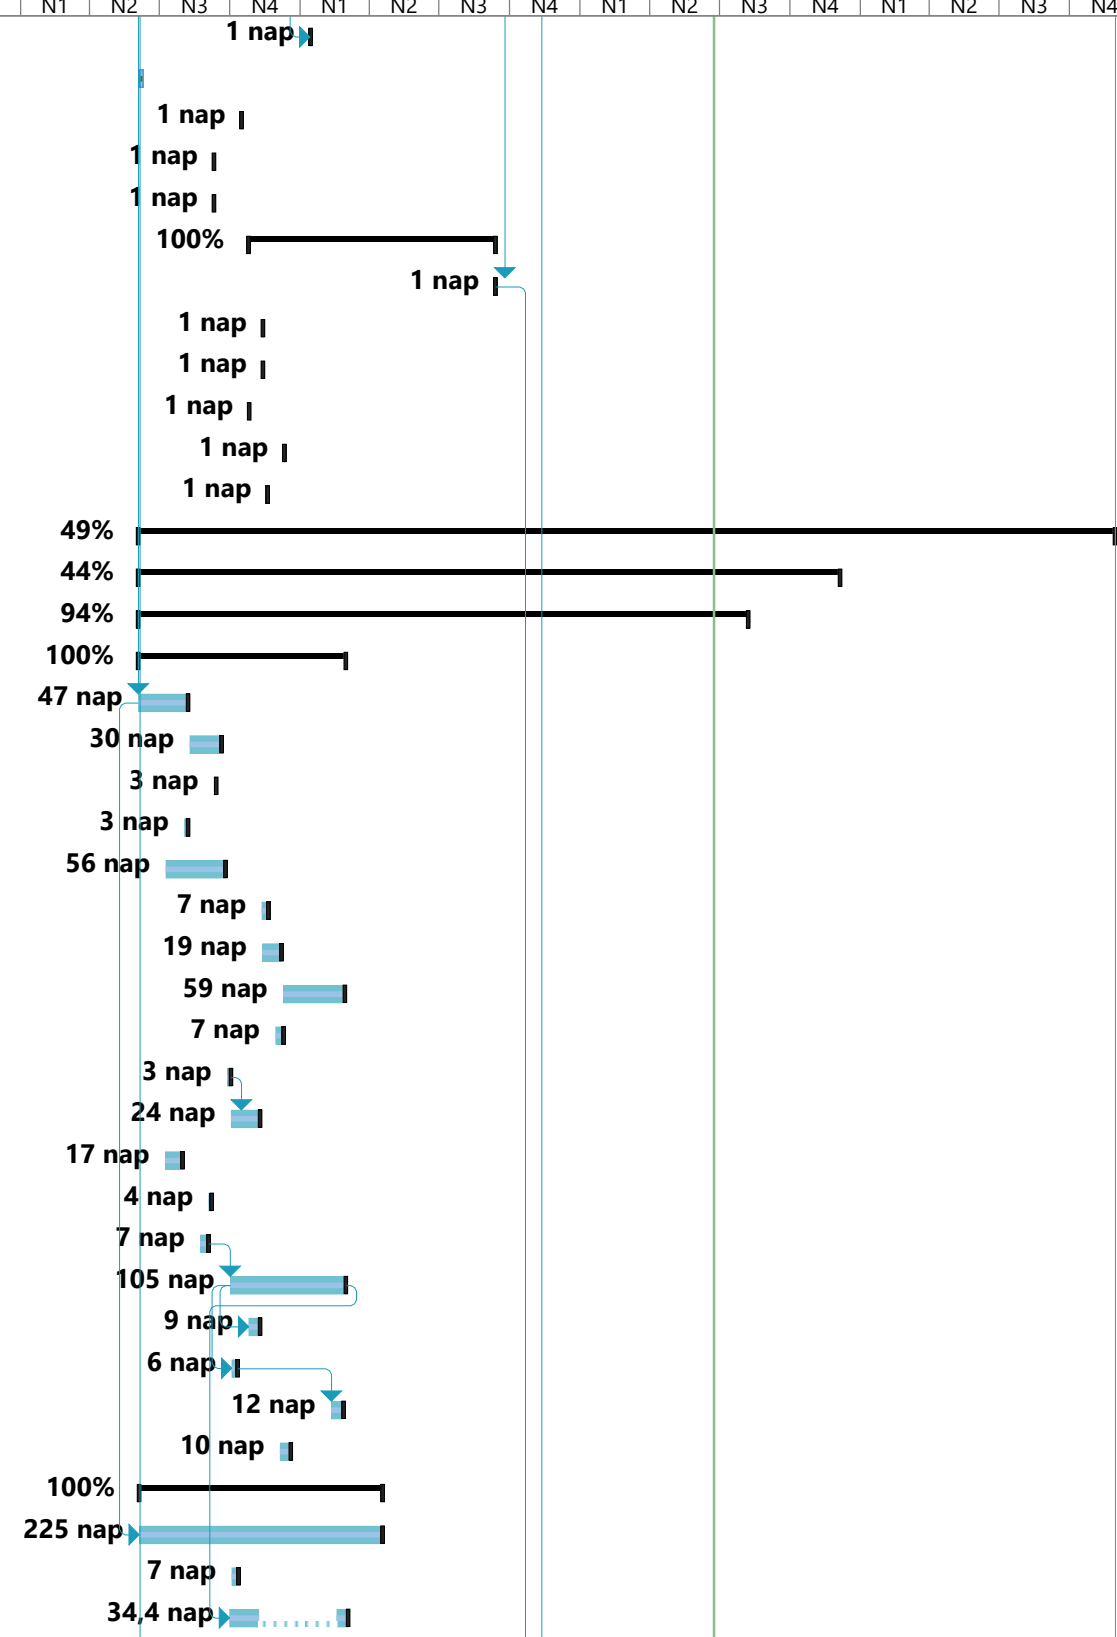




Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke- r ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018		2019				2020				2021				2022			
						N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1		
115		1-1-1 - Kossuth u.	2 nap	H 19.12.09.	K 19.12.10.																		
116		1-2-0 - Bocskai u.	5 nap	P 18.08.24.	Cs 18.08.30.																		
117		2-0-0 - Esze Tamás	337 nap	H 18.09.17.	K 19.12.31.																		
118		2-1-0 - Vasút u.	211 nap	H 19.06.03.	H 20.03.23.																		
119		2-1-1 - Vasút u.	27 nap	H 19.06.03.	K 19.07.09.																		
120		2-1-2 - Bercsényi u.	30 nap	Cs 19.08.01.	Sze 19.09.11.																		
121		2-1-3 - Hunyadi u.	40 nap	Sze 19.11.27.	K 20.01.21.																		
122		2-1-3-1 - Vasút u.	2 nap	Cs 19.06.06.	P 19.06.07.																		
123		2-2-0 - Kossuth u.	34 nap	H 19.06.10.	Cs 19.07.25.																		
124		2-3-0 - Petőfi u.	43 nap	Sze 19.05.08.	Cs 19.07.04.																		
125		2-3-1 - Petőfi u.	20 nap	H 19.12.09.	P 20.01.03.																		
126		2-4-0 - Bajcsi Zs.	30 nap	H 20.01.06.	P 20.02.14.																		
127		3-0-0 - Honvéd u.	255 nap	K 18.06.12.	H 19.06.03.																		
128		3-1-0 - Béke u.	2 nap	P 18.06.22.	H 18.06.25.																		
129		3-2-0 - Lenin u.	30 nap	H 19.02.11.	P 19.03.22.																		
130		4-0-0 - Petőfi u., József A.	27 nap	K 18.10.09.	K 18.11.20.																		
131		4-1-0 - József A.u.	37 nap	K 19.04.23.	K 19.06.11.																		
132		4-2-0 - József, Arany u.	70 nap	H 18.09.03.	Sze 18.12.12.																		
133		4-2-1 - Arany J. u.	4 nap	Cs 18.06.21.	K 18.06.26.																		
134		4-2-2 - Kölcsey u.	4 nap	H 18.09.17.	Cs 18.09.20.																		
135		4-3-0 - Temető u.	10 nap	H 19.04.08.	P 19.04.19.																		
136		4-4-0 - Táncsics	27 nap	H 19.02.18.	K 19.03.26.																		
137		4-5-0 - Jókai u.	10 nap	K 19.03.26.	H 19.04.08.																		
138		Nyomó vezeték	322 nap	K 18.10.09.	K 19.12.31.																		
139		NY-1 - Kossuth u.	20 nap	P 19.07.12.	Cs 19.08.08.																		
140		NY-2 - Vasút u.	20 nap	P 19.07.26.	Cs 19.08.22.																		
141		NY-3 - Vasút u.	88 nap	H 19.09.02.	K 19.12.31.																		
142		NY-4 - József A. u.	45 nap	K 18.10.09.	Cs 18.12.13.																		
143		Végleges helyreállítás	192 nap	H 19.10.07.	K 20.06.30.																		
144		Átemelő	151 nap	H 19.09.16.	P 20.04.10.																		
145		Á-1	148 nap	Cs 19.09.19.	P 20.04.10.																		
146		Építészeti munkák	3 nap	Cs 19.09.19.	H 19.09.23.																		
147		Gépészeti munkák	20 nap	H 20.02.17.	P 20.03.13.																		
148		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 20.03.16.	P 20.04.10.																		
149		Á-2	103 nap	H 19.09.16.	K 20.02.04.																		
150		Építészeti munkák	3 nap	H 19.09.16.	Sze 19.09.18.																		
151		Gépészeti munkák	20 nap	Sze 19.12.11.	K 20.01.07.																		
152		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	Sze 20.01.08.	K 20.02.04.																		
153		Á-3	148 nap	Cs 19.09.19.	P 20.04.10.																		



Műszaki és tervezési ütemterv


Azonos	Tevéke- ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdet	Befejezés	2018		2019				2020				2021				2022				
						N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1			
154		Építészeti munkák	3 nap	Cs 19.09.19.	K 19.10.01.																			
155		Gépészeti munkák	20 nap	H 20.02.17.	P 20.03.13.																			
156		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 20.03.16.	P 20.04.10.																			
157		Á-4	148 nap	Cs 19.09.19.	P 20.04.10.																			
158		Építészeti munkák	3 nap	Cs 19.09.19.	H 19.09.23.																			
159		Gépészeti munkák	20 nap	H 20.02.17.	P 20.03.13.																			
160		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 20.03.16.	P 20.04.10.																			
161		Telep	393 nap	K 19.05.07.	K 20.11.03.																			
162		Föld feltöltés	75 nap	H 19.05.20.	P 19.08.30.																			
163		Biológiai reaktor építése	61 nap	K 19.05.07.	H 19.07.29.																			
164		Izaptároló építése	70 nap	Sze 19.08.14.	H 19.11.18.																			
165		Utak, járdák, kerítés építése, füvesítés	140 nap	K 19.10.01.	H 20.04.13.																			
166		Udvartéri vezetékek, műtárgy gépészet, rácsok, korlátok, fedlapok gyártása, szerelése	120 nap	Cs 19.08.01.	K 20.01.14.																			
167		Műtárgyak építése (csurgalékvíz átemelő, fertőtlenítő medence, tisztított szennyvíz átemelő, szennyvízátemelő, szennyvízmérő akna, ivóvízmérő akna)	59 nap	Sze 19.07.10.	Szo 19.09.28.																			
168		Kezelőépület építészet gépészet	100 nap	K 19.09.10.	P 20.01.24.																			
169		Próbaüzem	184 nap	H 20.05.04.	K 20.11.03.																			
170		Mándok	225 nap	H 19.11.18.	P 20.09.25.																			
171		Hálózat ideiglenes helyreállítással	225 nap	H 19.11.18.	P 20.09.25.																			
172		1-0-0 Dózsa Gy. út	29 nap	H 20.05.04.	Cs 20.06.11.																			
173		1-1-0 Dózsa Gy. út	6 nap	P 20.06.12.	P 20.06.19.																			
174		2-1-0 Nyárfás út	36 nap	H 19.12.16.	H 20.02.03.																			
175		2-1-1 Táncsics út	6 nap	K 20.02.04.	K 20.02.11.																			
176		2-1-2 Arany J. út	18 nap	Sze 20.02.12.	P 20.03.06.																			
177		2-3-0 Mező út	43 nap	H 19.12.02.	Sze 20.01.29.																			
178		2-1-1-1 Bem J. út	0 nap	P 20.02.28.	P 20.02.28.																			
179		3-1-0 Vasvári P. út	30 nap	H 20.03.02.	P 20.04.10.																			
180		4-0-0 Bajcsy Zs. út	46 nap	Sze 20.02.05.	Sze 20.04.08.																			
181		5-0-0 Honvéd út	27 nap	K 20.03.03.	Sze 20.04.08.																			
182		6-0-0 Ságvári út	46 nap	H 19.11.25.	H 20.01.27.																			
183		7-0-0 Ady E. út	7 nap	H 20.06.22.	K 20.06.30.																			
184		7-0-1 Petőfi út	22 nap	Sze 20.07.01.	Cs 20.07.30.																			
185		7-2-2 Rákóczi F. út	15 nap	P 20.06.12.	Cs 20.07.02.																			
186		Nyomó vezeték	165 nap	H 19.11.18.	P 20.07.03.																			
187		NY-1 Dózsa Gy.	6 nap	P 20.06.26.	P 20.07.03.																			
188		Ny-2 Dózsa, Arany, Táncsics, Nyárfás	159 nap	H 19.11.18.	Cs 20.06.25.																			

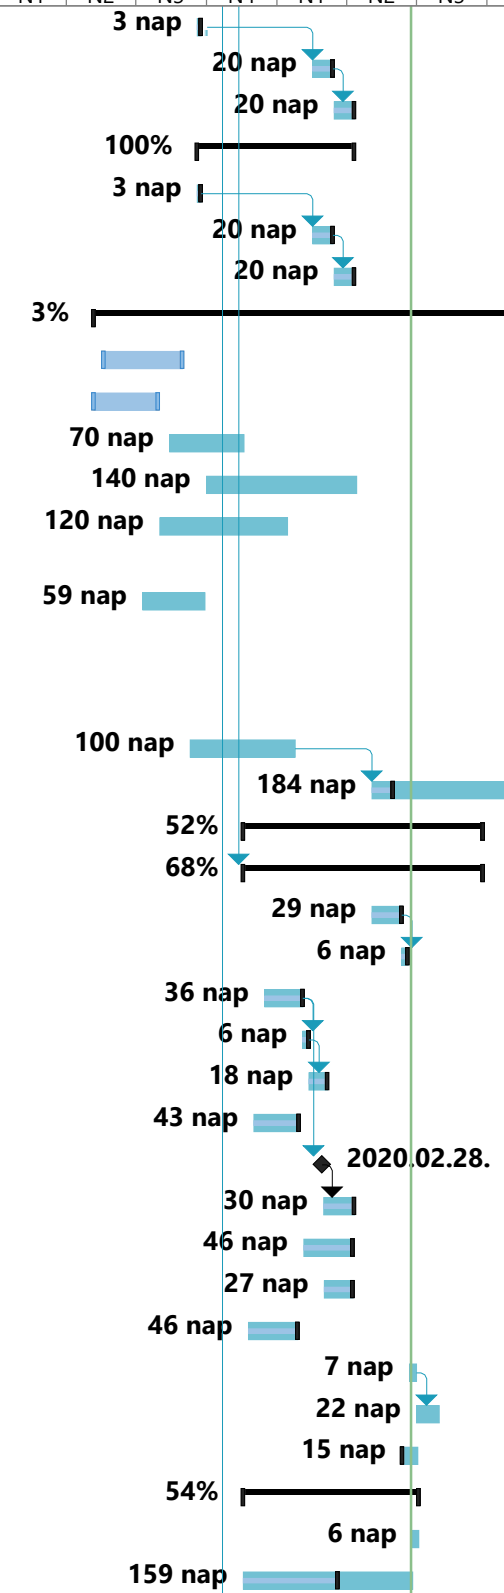



Műszaki és tervezési ütemterv


Azonos	Tevéke- r ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018		2019				2020				2021				2022			
						N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1		
189		Végleges helyreállítás	60 nap	H 20.07.06.	P 20.09.25.																		
190		Telep	121 nap	H 20.02.03.	H 20.07.20.																		
191		Kivitelezési munkák	169 nap	H 20.02.03.	H 20.07.20.																		
192		Gávavencsellő	621 nap	H 18.07.02.	P 20.11.13.																		
193		Hálózat ideiglenes helyreállítással	531 nap	H 18.07.02.	P 20.07.10.																		
194		I. ütem	125 nap	H 18.07.02.	H 18.12.24.																		
213		II. ütem	368 nap	P 19.02.15.	P 20.07.10.																		
214		Gravitációs vezeték	314 nap	P 19.02.15.	H 20.04.27.																		
215		1-0-0 Vasvári Pál u.	8 nap	Cs 19.05.23.	H 19.06.03.																		
216		1-0-0 Halász u.	15 nap	Cs 19.05.23.	Sze 19.06.12.																		
217		1-1-0 Vasvári Pál u.	11 nap	Cs 19.05.09.	Cs 19.05.23.																		
218		1-1-0 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.																		
219		1-1-1 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.																		
220		1-1-2 Arany János u.	5 nap	Sze 19.04.17.	K 19.04.23.																		
221		1-2-0 Halász u.	7 nap	Cs 19.05.09.	P 19.05.17.																		
222		2-0-0 Rákóczi Ferenc u.	4 nap	Szo 19.05.18.	Sze 19.05.22.																		
223		2-0-0 Arany János u.	8 nap	Cs 19.05.23.	H 19.06.03.																		
224		2-1-0 Rákóczi Ferenc u.	3 nap	K 19.06.04.	Cs 19.06.06.																		
225		3-0-0 Fertő u.	16 nap	Sze 19.03.20.	Sze 19.04.10.																		
226		3-1-0 Fertő u.	3 nap	H 19.04.15.	Sze 19.04.17.																		
227		3-1-0 Kossuth u.	2 nap	K 19.04.23.	Cs 19.04.25.																		
228		4-0-0 Kossuth u.	6 nap	K 19.03.19.	K 19.03.26.																		
229		4-1-0 Kossuth u.	9 nap	Sze 19.03.06.	H 19.03.18.																		
230		M-4-0-0 Báthori u.	1 nap	K 19.08.20.	K 19.08.20.																		
231		M-4-0-0 Arany János u.	18 nap	H 19.07.22.	Sze 19.08.14.																		
232		M-4-1-0 Báthory u.	3 nap	Cs 19.08.15.	H 19.08.19.																		
233		5-0-0 Bem József u.	14 nap	H 19.03.18.	Cs 19.04.04.																		
234		5-1-0 Bem József u.	8 nap	Cs 19.03.07.	H 19.03.18.																		
235		6-0-0 Major u.	3 nap	P 19.03.15.	K 19.03.19.																		
236		6-0-0 Lehel u.	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.																		
237		6-1-0 Major u.	13 nap	P 19.02.15.	K 19.03.05.																		
238		6-1-0 Ady Endre u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.																		
239		7-0-0 Tisza u.	14 nap	P 20.03.13.	Sze 20.04.01.																		
240		7-1-0 Tisza u.	3 nap	H 19.11.18.	Sze 19.11.20.																		
241		M-7/a-0-0 Petőfi Sándor u.	11 nap	P 20.03.20.	P 20.04.03.																		
242		8-0-0 Tisza u.	16 nap	H 20.02.10.	H 20.03.02.																		
243		8-1-0 Tisza u.	10 nap	H 20.03.09.	P 20.03.20.																		
244		8-2-0 Kovács Mihály u.	24 nap	K 20.03.03.	P 20.04.03.																		
245		9-0-0 Báthori u.	10 nap	H 19.08.19.	P 19.08.30.																		

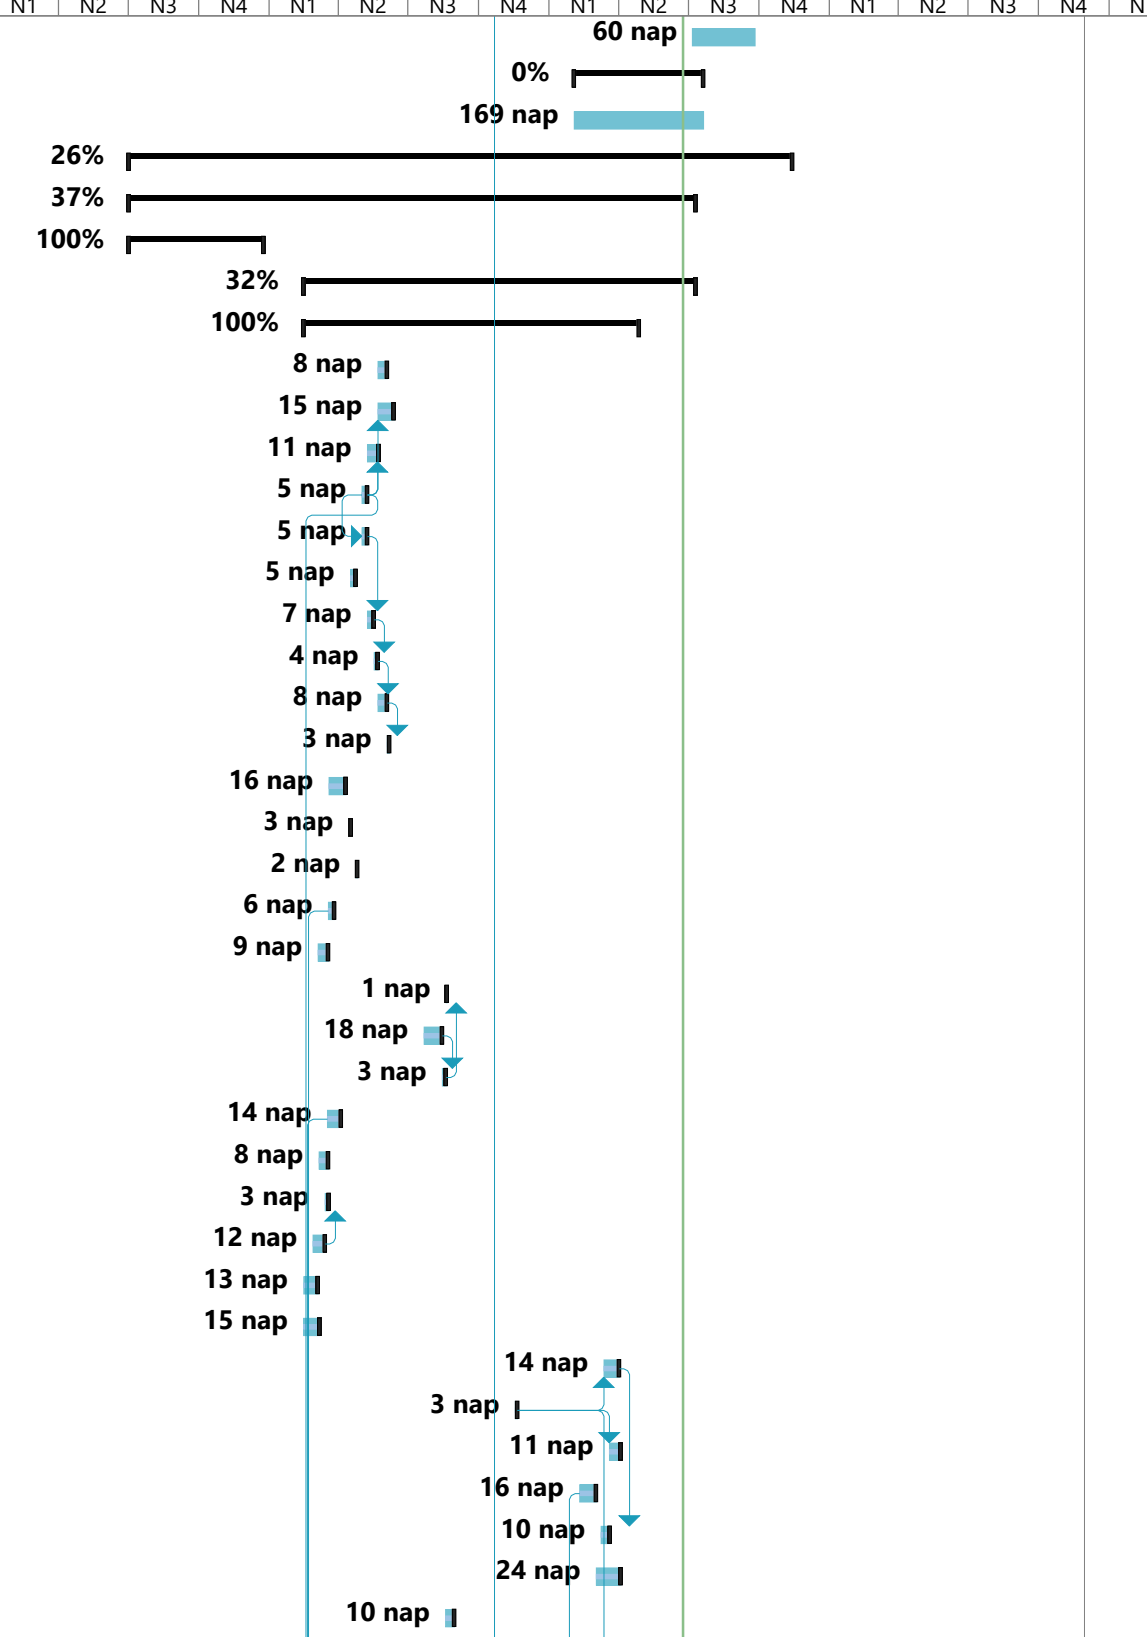



Műszaki és tervezési ütemterv


Azonos	Tevéke- r ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018		2019				2020				2021				2022			
						N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1		
246		9-0-0 Honvéd u.	6 nap	H 19.08.12.	H 19.08.19.																		
247		9-1-0 Báthori u.	4 nap	K 19.08.27.	P 19.08.30.																		
248		10-0-0 Báthori u.	15 nap	K 19.09.03.	H 19.09.23.																		
249		10-1-0 Báthori u.	13 nap	K 19.09.24.	Sze 19.10.09.																		
250		11-0-0 Lónyai u.	5 nap	H 20.04.13.	P 20.04.17.																		
251		11-1-0 Lónyai u.	1 nap	H 20.04.20.	H 20.04.20.																		
252		12-0-0 Móricz Zsigmond u.	5 nap	K 20.04.21.	H 20.04.27.																		
253		13-0-0 Rakovszki u.	6 nap	Cs 19.03.28.	Cs 19.04.04.																		
254		Nyomó vezeték	306 nap	Sze 19.02.27.	H 20.04.27.																		
255		NY-1	226 nap	P 19.03.15.	K 20.03.17.																		
256		NY-2	6 nap	Sze 19.07.03.	Sze 19.07.10.																		
257		NY-3	15 nap	P 19.04.05.	Cs 19.04.25.																		
258		NY-4	4 nap	K 19.03.19.	P 19.03.22.																		
259		NY-5	10 nap	H 19.03.18.	P 19.03.29.																		
260		NY-6	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.																		
261		NY-7	7 nap	P 20.03.13.	H 20.03.23.																		
262		NY-8	12 nap	H 20.03.02.	K 20.03.17.																		
263		NY-9	4 nap	H 19.09.02.	Cs 19.09.05.																		
264		NY-10	1 nap	Cs 19.10.10.	Cs 19.10.10.																		
265		NY-11	5 nap	H 20.04.20.	P 20.04.24.																		
266		NY-12	5 nap	K 20.04.21.	H 20.04.27.																		
267		NY-13	5 nap	Cs 19.03.28.	Sze 19.04.03.																		
268		NYG-1	50 nap	H 19.10.14.	P 19.12.20.																		
269		Átemelők	162 nap	H 19.11.18.	K 20.06.30.																		
270		G1 végátemelő	60 nap	P 19.11.22.	Cs 20.02.13.																		
271		1. sz.	138 nap	P 19.12.20.	K 20.06.30.																		
272		2. sz.	140 nap	Sze 19.12.18.	K 20.06.30.																		
273		3. sz.	142 nap	H 19.12.16.	K 20.06.30.																		
274		4. közt. Kisátm.	141 nap	K 19.12.17.	K 20.06.30.																		
275		5. sz.	162 nap	H 19.11.18.	K 20.06.30.																		
276		6. sz.	122 nap	H 20.01.13.	K 20.06.30.																		
277		7. közt. Kisátm.	120 nap	Sze 20.01.15.	K 20.06.30.																		
278		8. sz.	112 nap	H 20.01.27.	K 20.06.30.																		
279		9. sz.	149 nap	Cs 19.12.05.	K 20.06.30.																		
280		10. sz.	155 nap	Sze 19.11.27.	K 20.06.30.																		
281		11. közt. Kisátm.	117 nap	H 20.01.20.	K 20.06.30.																		
282		12. közt. Kisátm.	109 nap	Cs 20.01.30.	K 20.06.30.																		
283		13. közt. Kisátm.	60 nap	Sze 20.04.08.	K 20.06.30.																		
284		Végleges helyreállítás	60 nap	H 20.04.20.	P 20.07.10.																		

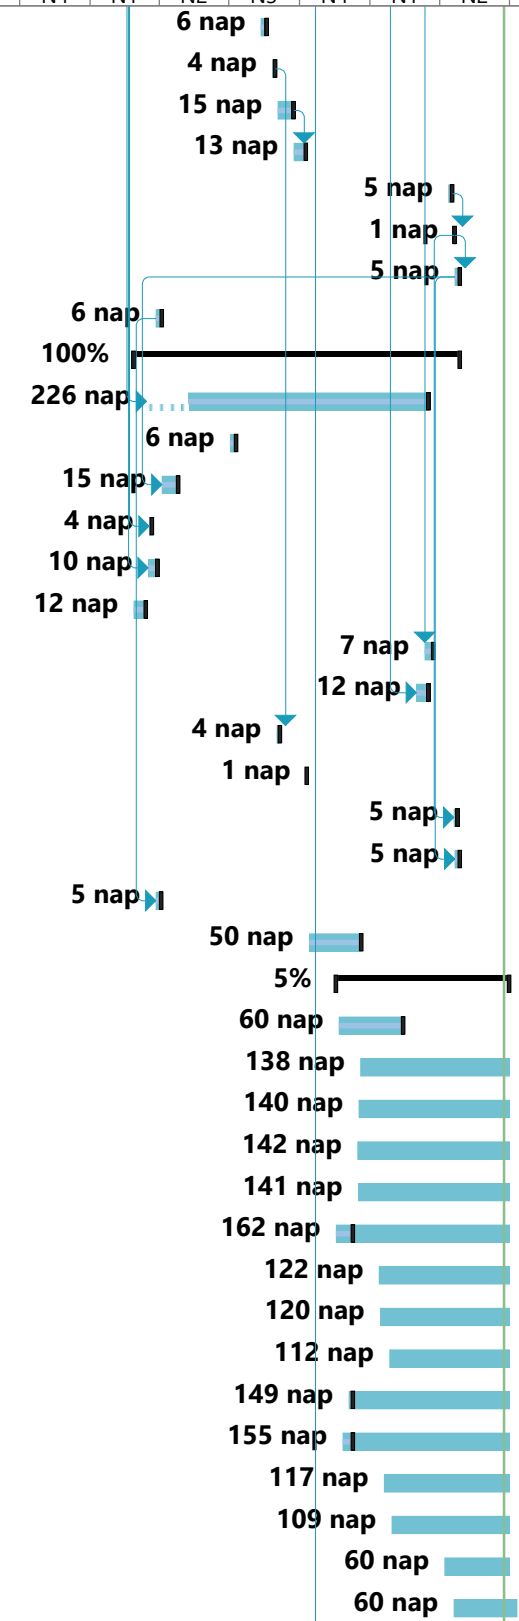



Műszaki és tervezési ütemterv


Azonos	Tevéke- r ütemez	Tevékenysé- g neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018		2019				2020				2021				2022		
						N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	
285		Telep	429 nap	Cs 19.03.28.	P 20.11.13.																	
286		Szociális és kezelő épület építése	190 nap	Sze 19.04.03.	P 19.12.20.																	
287		I. Reaktor építése	162 nap	Cs 19.03.28.	H 19.12.09.																	
288		II. Reaktor építése	120 nap	Cs 19.06.06.	P 19.12.20.																	
289		Utóülepítő medence építése	130 nap	K 19.05.07.	Cs 19.10.31.																	
290		Fertőtlenítő medence építése	90 nap	Sze 19.05.29.	H 19.09.30.																	
291		Izlapstabilizáló-sűrítő építése	75 nap	Sze 19.05.29.	Sze 19.10.09.																	
292		Csurgalékvíz átemelő építése	20 nap	P 19.09.20.	Sze 19.10.16.																	
293		Tisztított szennyvíz átemelő építése	20 nap	P 19.09.20.	Sze 19.10.16.																	
294		Egyéb műtárgyak építése	70 nap	Sze 19.07.17.	H 19.10.21.																	
295		Vassó tároló, Vízmérőműtárgyak, Osztóakna 1-2, Motorostolózár akna,	70 nap	Sze 19.07.17.	H 19.10.21.																	
296		Udvartéri vezetékek, közművek	35 nap	H 19.10.28.	P 19.12.13.																	
297		Technológiai gépészeti szerelés	30 nap	P 20.01.31.	Cs 20.03.12.																	
298		Elektromos erős-gyengeáram és irányítástechnikai szerelések	40 nap	P 20.01.10.	Cs 20.03.05.																	
299		Kerítés, térburkolat építés, csapadékvíz- tereprendezés	120 nap	K 19.10.29.	H 20.04.13.																	
300		Üzempróbák	10 nap	P 20.03.13.	Cs 20.03.26.																	
301		Próbaüzem	184 nap	Cs 20.05.14.	P 20.11.13.																	
302		Tiszatelek-Beszterec-Újdombrád	807 nap	P 18.11.02.	H 21.11.29.																	
303		Tiszatelek - Hálózat ideiglenes helyreállítással	540 nap	P 19.02.15.	H 21.03.08.																	
304		1-0-0 Kossuth u.	20 nap	H 19.07.29.	P 19.08.23.																	
305		1/1-0-0 Dózsa Gy.	25 nap	H 19.07.08.	P 19.08.09.																	
306		2-0-0 Kossuth u.	70 nap	P 19.05.10.	Cs 19.08.15.																	
307		2-1-0 Kossuth, Damjanich, Petőfi u.	40 nap	K 19.05.21.	H 19.07.15.																	
308		2-2-0 Damjanich J. u	10 nap	P 20.01.10.	Cs 20.01.23.																	
309		2-3-0 Petőfi u.	7 nap	H 19.09.23.	H 19.09.30.																	
310		3-0-0 Kossuth u.	30 nap	H 19.04.22.	P 19.05.31.																	
311		3-1-0 Kossuth u.	87 nap	P 19.05.03.	P 19.08.30.																	
312		3-2-0 Szántó-K. J. u	8 nap	Sze 19.10.02.	P 19.10.11.																	
313		4-0-0 Tanács, Zrínyi Ilona u.	40 nap	H 20.01.20.	P 20.03.13.																	
314		4-1-0 Zrínyi Ilona u.	11 nap	K 19.11.05.	K 19.11.19.																	
315		4-2-0 Tanács u.	8 nap	Sze 19.11.20.	P 19.11.29.																	
316		5-0-0 Kossuth u.	11 nap	H 20.05.04.	H 20.05.18.																	
317		7-0-0 Árpád, Fürst S. út	16 nap	K 20.03.31.	K 20.04.21.																	
318		7-1-0 Fürst S. út	4 nap	Sze 20.04.22.	H 20.04.27.																	
319		7-2-0 József A. u.	32 nap	K 19.12.03.	Sze 20.01.15.																	
320		7-3-0 Iskola u	26 nap	K 19.12.03.	K 20.01.07.																	

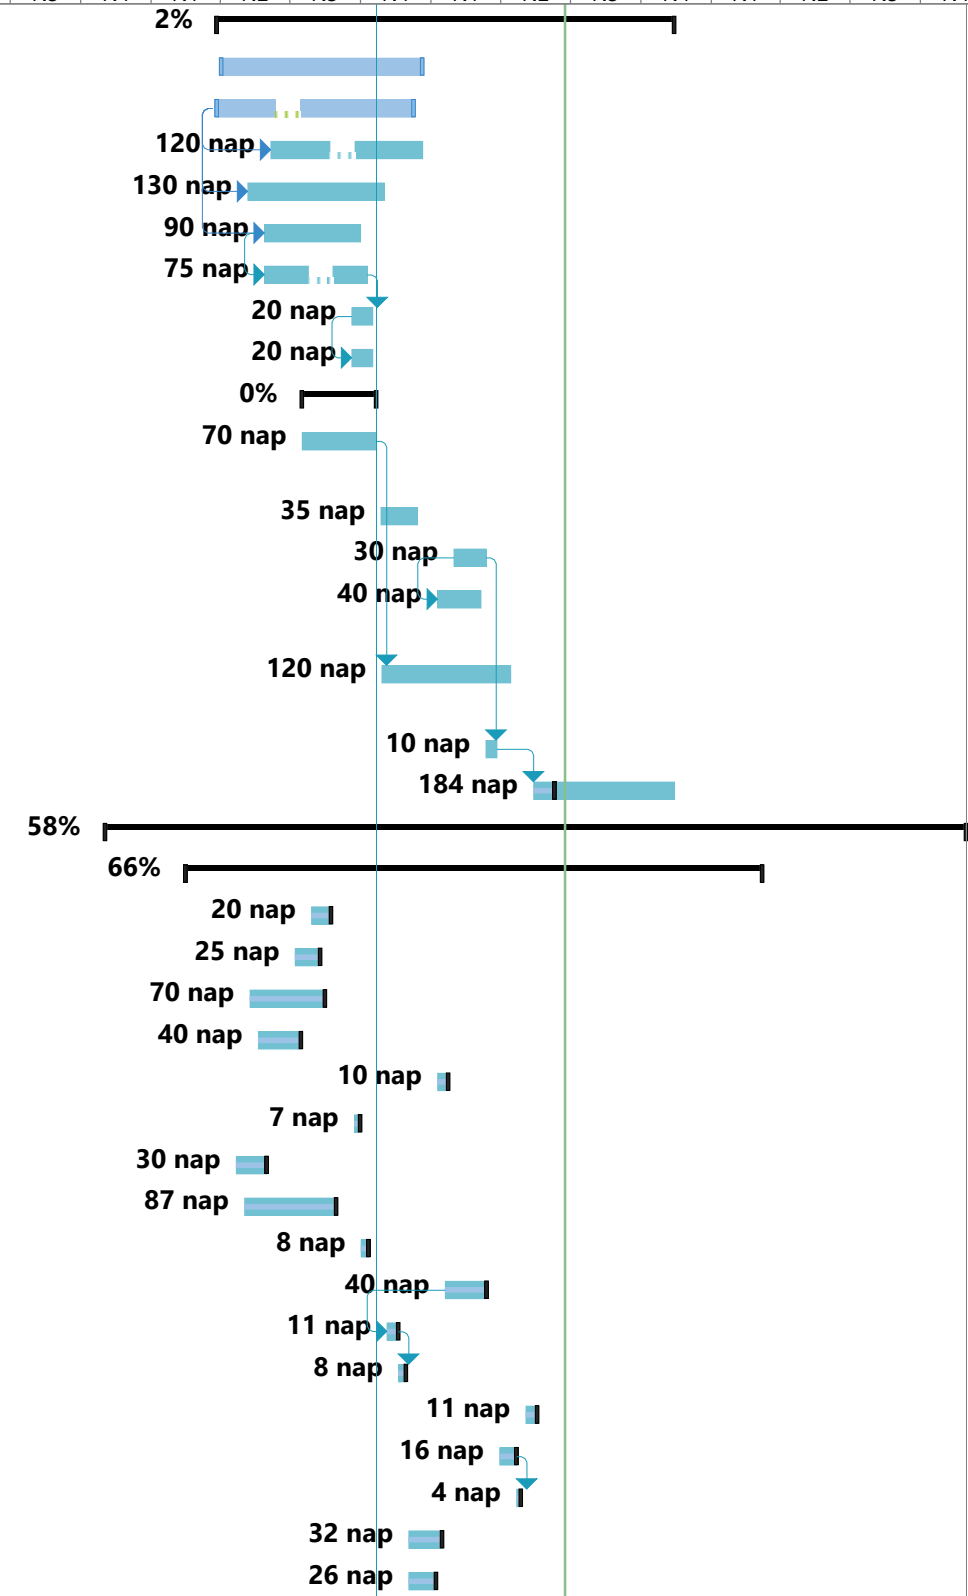



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéke- ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018		2019				2020				2021				2022		
						N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	
321		8-0-0 Arany J.u	15 nap	Cs 19.11.07.	Sze 19.11.27.																	
322		8-1-0 Árpád, Arany J.u	11 nap	Sze 20.03.11.	Sze 20.03.25.																	
323		8-1-1 Árpád u.	5 nap	P 20.04.10.	Cs 20.04.16.																	
324		9-0-0 Dózsa Gy.	48 nap	Sze 19.08.21.	Cs 19.10.24.																	
325		9-1-0 Dózsa Gy.	36 nap	P 19.09.13.	Cs 19.10.31.																	
326		10-0-0 Dózsa Gy.	13 nap	Cs 19.08.08.	H 19.08.26.																	
327		10-1-0 Dózsa Gy.	5 nap	P 19.08.09.	Cs 19.08.15.																	
328		11-0-0 Esze Tamás u.	38 nap	Cs 20.04.02.	H 20.05.25.																	
329		11-0-0 Sallai u.	9 nap	P 19.03.08.	Sze 19.03.20.																	
330		11-1-0 Esze Tamás u.	284 nap	Cs 19.03.21.	H 20.05.18.																	
331		11-2-0 Esze Tamás u.	281 nap	H 19.03.25.	H 20.05.18.																	
332		12-0-0 Rákóczi u.	233 nap	H 19.03.11.	P 20.02.28.																	
333		13-0-0 Ady E.u.	14 nap	H 20.02.10.	Cs 20.02.27.																	
334		Nyomó vezeték	540 nap	P 19.02.15.	H 21.03.08.																	
335		NY-1	30 nap	H 20.06.01.	P 20.07.10.																	
336		NY-1/1	34 nap	Sze 19.07.10.	K 19.10.08.																	
337		NY-2	82 nap	H 19.05.20.	K 19.09.10.																	
338		NY-3	303 nap	Cs 19.04.04.	P 20.05.29.																	
339		NY-4	30 nap	Cs 19.10.17.	Sze 19.11.27.																	
340		NY-5	50 nap	H 20.05.04.	P 20.07.10.																	
341		NY-6	3 nap	H 20.07.13.	Sze 20.07.15.																	
342		NY-7	59 nap	H 20.02.03.	Cs 20.04.23.																	
343		NY-8	180 nap	H 19.11.04.	P 20.07.10.																	
344		NY-9	367 nap	P 19.02.15.	P 20.07.10.																	
345		NY-10	230 nap	Cs 19.08.08.	P 20.07.10.																	
346		NY-11	45 nap	H 20.05.11.	P 20.07.10.																	
347		NY-12	173 nap	Sze 19.11.13.	H 21.03.08.																	
348		NY-13	25 nap	H 20.06.08.	P 20.07.10.																	
349		Végleges helyreállítás	50 nap	K 20.05.26.	H 20.08.03.																	
350		Átemelő aknák	353 nap	H 19.07.29.	K 20.12.01.																	
351		Á-1	236 nap	Sze 19.08.07.	K 20.06.30.																	
352		Á-2	243 nap	H 19.07.29.	K 20.06.30.																	
353		Á-3	238 nap	H 19.08.05.	K 20.06.30.																	
354		Á-4	218 nap	H 19.09.02.	K 20.06.30.																	
355		Á-5	212 nap	K 19.09.10.	K 20.06.30.																	
356		Á-6	82 nap	H 20.03.09.	K 20.06.30.																	
357		Á-7	216 nap	Sze 19.09.04.	K 20.06.30.																	
358		Á-8	215 nap	Cs 19.09.05.	K 20.06.30.																	
359		Á-9	107 nap	H 20.02.03.	K 20.06.30.																	

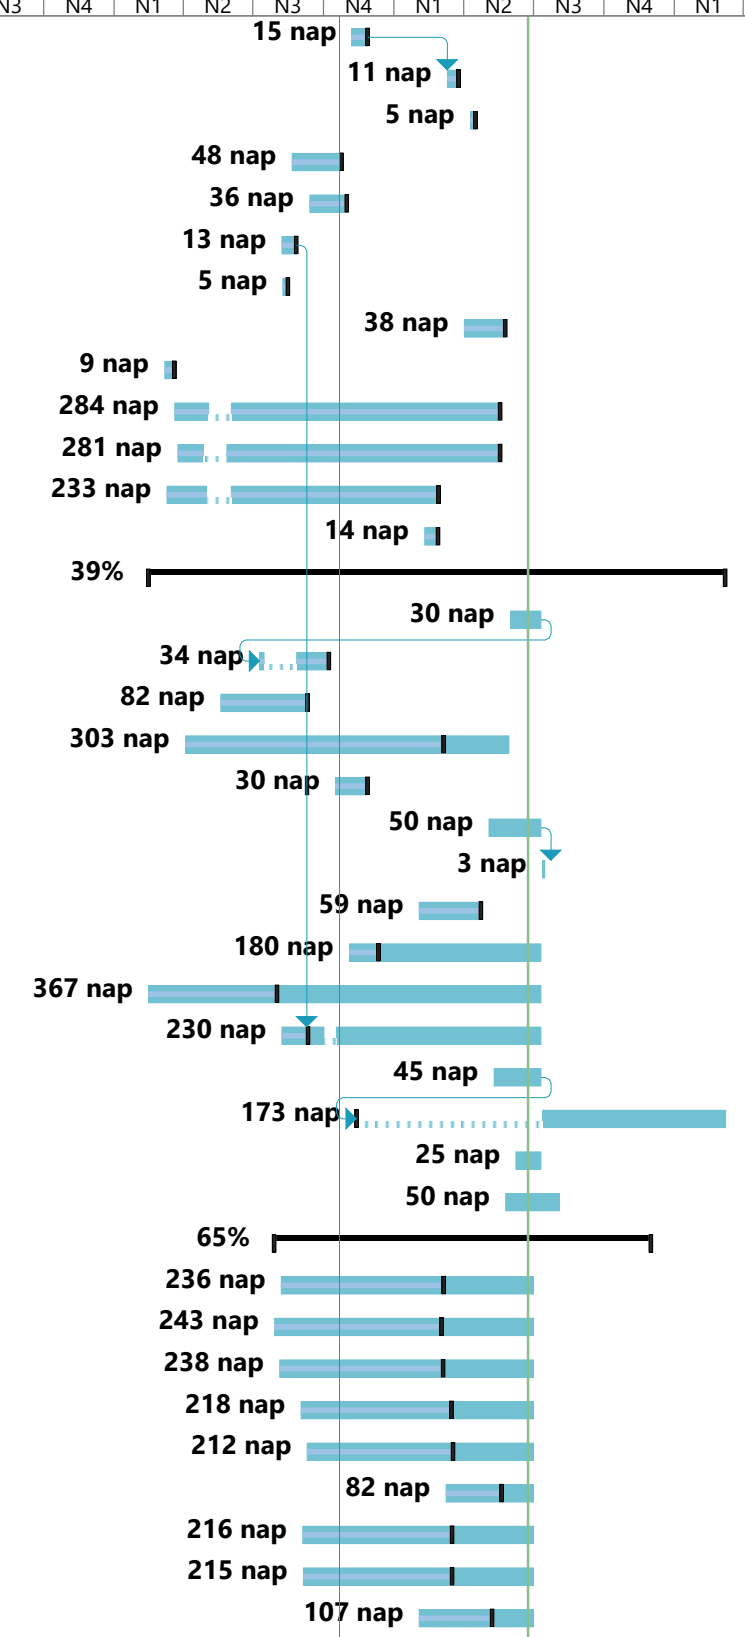



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevéker ütemez	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018		2019				2020				2021				2022					
						N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1				
399		Gépészeti munkák	10 nap	K 19.09.17.	Szo 19.09.28.																				
400		Elektromos és irányítástechnikai munkák	46 nap	H 20.03.16.	H 20.05.18.																				
401		Á-4	272 nap	H 19.07.08.	H 20.07.20.																				
402		Építészeti munkák	27 nap	H 19.07.08.	K 19.08.13.																				
403		Gépészeti munkák	10 nap	K 20.05.26.	H 20.06.08.																				
404		Elektromos és irányítástechnikai munkák	91 nap	H 20.03.16.	H 20.07.20.																				
405		Újdombrád - Hálózat ideiglenes helyreállítással	475 nap	P 18.11.02.	P 20.08.21.																				
406		Gravitációs vezeték	456 nap	P 18.11.02.	H 20.07.27.																				
407		1-0-0 Fő u.	71 nap	H 20.03.16.	H 20.06.22.																				
408		1-0-0 József A.u	79 nap	H 18.11.26.	Cs 19.03.14.																				
409		1-1-0 Virág u.	18 nap	P 18.11.02.	K 18.11.27.																				
410		1-1-0 336 sz u	7 nap	H 18.11.19.	K 18.11.27.																				
411		1-2-0 Szabadság u.	9 nap	K 18.12.11.	Cs 18.12.20.																				
412		2-0-0 Szabadság u.	317 nap	Sze 19.04.17.	K 20.06.30.																				
413		2-0-0 Templom u.	25 nap	H 19.02.11.	P 19.03.15.																				
414		2-0-0 Iskola u.	2 nap	P 19.02.22.	H 19.02.25.																				
415		2-1-0 Szabadság u.	6 nap	K 19.02.12.	K 19.02.19.																				
416		2-2-0 Templom u	28 nap	K 19.01.08.	Cs 19.02.14.																				
417		2-3-0 Iskola u.	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.																				
418		2-3-0 Napsugár u	6 nap	P 19.01.04.	P 19.01.11.																				
419		2-4-0 Templom u	4 nap	K 19.02.05.	P 19.02.08.																				
420		2-4-0 Fő u.	21 nap	K 20.06.23.	K 20.07.21.																				
421		2-4-1 Dobi u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.																				
422		2-4-2 Fő u.	2 nap	K 20.06.23.	Sze 20.06.24.																				
423		2-5-0 Szabadság u.	5 nap	H 19.02.18.	P 19.02.22.																				
424		2-5-0 Fő u.	25 nap	K 20.06.23.	H 20.07.27.																				
425		2-5-1 Fő u.	7 nap	K 20.06.23.	Sze 20.07.01.																				
426		2-5-2 Iskola u.	10 nap	P 19.03.01.	Cs 19.03.14.																				
427		Nyomó vezeték	66 nap	Cs 18.12.13.	Sze 19.03.13.																				
428		NY-1	50 nap	Cs 18.12.13.	Sze 19.02.20.																				
429		NY-2	20 nap	Cs 19.02.14.	Sze 19.03.13.																				
430		Végleges helyreállítás	30 nap	H 20.07.13.	P 20.08.21.																				
431		Átemelő	269 nap	K 19.07.23.	Cs 20.07.30.																				
432		Á-1	266 nap	P 19.07.26.	Cs 20.07.30.																				
433		Építészeti munkák	20 nap	P 19.07.26.	Cs 19.08.22.																				
434		Gépészeti munkák	20 nap	Cs 20.05.14.	Sze 20.06.10.																				
435		Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	P 20.07.03.	Cs 20.07.30.																				
436		Á-1	269 nap	K 19.07.23.	Cs 20.07.30.																				
437		Építészeti munkák	20 nap	K 19.07.23.	H 19.08.19.																				

